

# 2018年广东省医疗卫生健康事业发展专项资金（传承发展中医药事业）绩效评价报告

主管部门：广东省中医药局

填报处室：规财（人事）处

联系电话：020-83064128

## 目 录

一、项目基本情况及自评结论.....	- 1 -
(一) 项目资金安排情况.....	- 1 -
(二) 项目实施主要内容及实施程序.....	- 7 -
二 绩效表现.....	- 48 -
(一) 资金到位情况简述.....	- 48 -
(二) 资金使用绩效情况评价.....	- 51 -
(三) 存在的问题.....	- 80 -
三 改进意见.....	- 94 -
(一) 解决自评材料未交或资料不完整问题的建议.....	- 94 -
(二) 经济性评价的建议.....	- 94 -
(三) 效率性评价的建议.....	- 94 -
(四) 效果性评价的建议.....	- 95 -
(五) 公平性评价存在的建议.....	- 96 -
附录 1.....	- 97 -
附录 2.....	- 98 -
附录 3.....	- 99 -
附录 4.....	- 106 -
附录 5.....	- 117 -

## 一、项目基本情况及自评结论

### （一）项目资金安排情况

#### 1、项目资金安排概况

据广东省中医药局文件《关于提前下达 2018 年医疗卫生健康事业发展专项资金专项资金（传承发展中医药事业）的通知》（粤财社〔2017〕326 号）、《关于批复 2018 年省级部门预算的通知》（粤财预〔2018〕26 号）和《关于安排 2018 年医疗卫生健康事业发展专项资金专项资金（传承发展中医药事业）省级部分资金的通知》（粤财社〔2018〕45 号）的总体要求，为加快中医药强省建设，提高中医药服务能力，2018 年省财政安排省级中医药建设专项资金总额 20626 万元，其中“6 种分布于林地的中药材 DNA 条形码鉴定与种质资源遗传多样性评估”、“巴戟天和何首乌优良种质资源收集与繁育基地建设”、“肉桂优质苗生产体系建立”和“商标品牌宣传保护及培育”4 类不在广东省中医药局此次绩效考核范围。因此评价总金额为 20066 万元，用于支持全省中医药事业发展。统计截止至 2019 年 8 月 15 日，已经执行 14674.81 万元，总执行率 73.13%。其中，2018 年资金使用周期为一年的项目资金执行 10414.71 万元，执行率 83.08%，2018 年开始资金使用周期为两年的项目资金执行 2202.8 万元，执行率 49.61%，2018 年开始资金使用周期为三年的项目资金执行 2057.31 万元，执行率 66.58%。

其中，中医药建设专项资金共涉及以下 6 个方向（33 类）建设内容。

**（1）中医药服务体系建设。**省级中医医院设备及修缮项目 6631 万元，省、市级中医医院建设项目 3000 万元，中医药信息化规划能力及应用水平建设项目 277 万元。合计 9908 万元。

**（2）中医药服务能力建设。**中医院治未病中心（平台）建设项目 3100 万元，全省中医药适宜技术网络视频平台建设项目 1070 万元，全省中医类别医师资格实践技能考试片区基地建设项目 400 万元，综合医院中医药工作示范单位项目 250 万元。合计 4820 万元。

**（3）中医药人才建设及传承创新。**中医药特色技术传承人才培养项目 60 万元，县区级中医临床技术骨干培训项目 60 万元，国医大师学术思想传承项目 75 万，全国名中医工作室建设项目 200 万元，传染病中医药防治研究项目 40 万，

第六批全国老中医药专家师承项目继承人经典理论培训班项目 17 万元，全国基层名老中医药专家传承工作室继承人集中理论培训项目 18 万，中医药管理机构人才及中医院管理人才培训项目 30 万元，中医住院医师（全科医生）规范化培训师资培养项目 60 万元，第三批省名中医师承项目 330 万元，名中医传承工作室建设项目 800 万，省名中医工作津贴 80 万元，中医药创新研究中心建设项目 800 万元，面上科研项目 300 万元，中医药重点科研项目 210 万元，中医药单方验方及中医药特色技术方法整理研究及推广应用项目 250 万元。合计 3330 万元。

**（4）中医药文化与对外合作交流。**对外交流与合作项目 80 万元，省级中医药宣传平台项目 170 万元，中医药科普宣传项目 250 万元，中医药文化宣传教育基地建设项目 160 万元。合计 660 万元。

**（5）中医药专项建设工作。**考核、评审、检查、信息化及依法行政等管理工作项目 848 万元。合计 848 万元。

**（6）岭南中药材保护。**动态保护项目 50 万元，人才培养项目 50 万元，生产基地评估项目 80 万元，文化保护项目 200 万元，资源动态监测项目 120 万元。合计 500 万元。

## 2、项目资金分配依据

### （1）省级中医院设备及修缮

根据省级中医医院运营实际需要，安排省第二中医院、广州中医药大学第一附属医院和省中医院等 3 所省属中医医院的设备购置和房屋修缮专项经费共计 6631 万元。资金分配方法：因素法，常规性拨款项目。

### （2）省市级中医院建设

为健全中医药服务体系，安排潮州市中医院、湛江市第一中医院、骨伤科共 3 家未达三级中医院建设标准的省级、地市级中医院改造升级建设经费共计 3000 万元。资金分配方法：项目制。

### （3）中医药信息化规划能力及应用水平建设

为加强中医药信息化能力水平，安排省第二中医院构建中医药建设专项资金绩效管理和评价监控信息系统专项经费 60 万；安排省中医院（省中医药数据中心）负责全省市、县中医院信息技术骨干培训专项经费 17 万元；安排普宁市中医院和江门市五邑中医院恩平分院信息化安全和基础建设专项经费 200 万元，总

计 277 万元。资金分配方法：项目制。

#### **(4) 中医院治未病中心（平台）建设**

按照广东省中医治未病指导中心建设管理办法建设省级指导中心，安排省中医院、广州中医药大学第一附属医院等 5 所省属中医医院用于治未病专科的建设和发展；研究编写全省中医“治未病”指导手册、培训教材，中医药预防保健服务人员业务培训和中医“治未病”服务技术培训推广工作；承担行政主管部门交办的基层指导、考核及“治未病”区域发展研究工作专项经费 500 万元；按照国家局治未病科建设指南安排海珠区中医医院等 26 家医院建设治未病平台专项经费 2600 万元，总计 3100 万元。资金分配方法：因素法。

#### **(5) 全省中医药适宜技术网络视频平台建设**

为实现全省中医药适宜技术网络视频平台全覆盖，加强基层常见病多发病中医药适宜技术推广视频网络平台与基地建设，2018 年共安排 3 个省级基地专项运营维护资金各 50 万元，合计 150 万元；以及东莞与中山市无县级基地加上 21 个未设县级中医院共计 23 个基地建设专项资金各 40 万元，合计 920 万元，总计 1070 万。资金分配方法：因素法。

#### **(6) 全省中医类别医师资格实践技能考试片区基地建设**

为落实国家医师资格考试改革的工作要求，建设 4 个全省中医类别医师资格实践技能考试片区基地。安排粤东片区（嘉应学院医学院）、粤西片区（湛江中医药学校）、珠三角片区（佛山市中医院、江门市中医药职业技术学院）4 个基地建设专项经费总计 400 万，用于加强对片区基地的建设管理，强化省考区办的专人管理，及弥补工作经费的不足。资金分配方法：其他。

#### **(7) 综合医院中医药工作示范单位**

安排 5 所综合医院中医药工作示范单位建设。通过发挥综合医院中医示范单位的典型引领作用，加强综合医院中医药服务能力，促进综合医院中医药工作水平的整体提升，安排 5 所综合医院中医药工作示范单位建设，每个项目单位安排 50 万元，总计 250 万元。资金分配方法：因素法。

#### **(8) 中药特色技术传承人才培养**

开展全国中药特色技术传承人才培养项目，对纳入项目的 20 名培养对象，项目周期 3 年。2018 年按照每人 3 万元的标准安排培养经费，总计 60 万元。资金

分配方法：其他（遴选）。

#### **（9）县区级中医临床技术骨干培训**

开展县区级中医临床技术骨干培训，依托 6 家省属中医医院每家医院每年开展一期临床应用技术培训，每期培训 70 人，共计培训 420 人。对 6 家医院各补助 10 万元，总计安排 60 万元。资金分配方法：因素法。

#### **（10）国医大师学术思想传承**

深入开展国医大师学术经验传承工作，加强对我省 3 位国医大师邓铁涛、禩国维、周岱翰学术思想的研究整理工作，安排 3 个国医大师传承工作室项目单位按每个单位补助 25 万，总计 75 万元。资金分配方法：因素法。

#### **（11）全国名中医传承工作室建设**

安排我省 4 名全国名中医学术思想传承工作室建设。对每个名中医工作室补助 50 万，总计安排 200 万元。资金分配方法：因素法。

#### **（12）传染病中医药防治研究**

依托我省的国家中医药管理局中医药防治传染病重点研究室（广东省中医院、广州市第八人民医院）开展对新发、突发传染性疾病的中医药防治研究工作。每个单位支持工作经费 20 万元，共计安排 40 万元。资金分配方法：因素法。

#### **（13）第六批全国老中医药专家师承项目继承人经典理论培训**

安排广州中医药大学开展第六批全国老中医药专家师承项目继承人经典理论培训班，共培训继承人 76 人，培训周期为 5 天，按每人每天 450 元标准总计安排专项经费 17 万元。资金分配方法：其他（委托）。

#### **（14）全国基层名老中医药专家传承工作室继承人集中理论培训**

安排广州中医药大学组织继承人参加集中理论培训，学习中医典籍、经方、中药实践技能等内容，提升基层中医药人员的理论水平和临床技能，提升基层中医药服务能力。共培训继承人 100 人，培训周期为 5 天，总计安排专项经费 18 万元。资金分配方法：其他（委托）。

#### **（15）中医药管理机构人才及中医院管理人才培训**

委托中山大学管理学院开展培训项目，安排中医院管理人才培训经费 20 万，安排组织管理机构培训班经费 10 万，总计安排 30 万元。资金分配方法：其他（委托）。

### **(16) 中医住院医师（全科医生）规范化培训师资培养**

依托国家和省的中医住院医师（全科医生）规范化培训基地，按照中医住院医师、全科医生师资培训大纲，培训 200 名中医住院医师、全科医生师资，强化中医临床思维和中医全科医学服务理念、服务模式，满足基层群众对中医全科医生服务的需求，安排专项经费 60 万元。资金分配方法：其他（委托）。

### **(17) 第三批省名中医师承**

为加强省名中医的临床经验和学术思想的传承工作，安排 50 名指导老师，100 名传承人，按每人 2 万补助标准共安排 300 万元，同时参照国家中医药管理局相关文件，按 10% 比例预算 30 万用于项目过程管理，共计安排专项经费 330 万元。资金分配方法：因素法。

### **(18) 省名中医传承工作室建设**

为推进中医药专家学术传承工作遴选 40 位省中医药名专家，为每名专家建设一个传承工作室，每个工作室建设经费 30 万，建设周期 3 年，分 3 年安排补助，每年安排 10 万元，同时 2018 年度需安排 2017 年立项的 40 个工作室建设经费，每个 10 万，共计安排专项经费 800 万元。资金分配方法：因素法。

### **(19) 省名中医工作津贴**

用于补贴省名中医。最终公示名单 80 人，按每人 1 万的标准共安排专项经费 80 万。资金分配方法：项目制。

### **(20) 中医药创新研究中心建设**

安排建设 5 个高水平的研究平台，以推进中医药科学研究、加强中医药协同创新、建设一支高水平的中医药队伍。安排省第二中医院、广州中医药大学第一附属医院、省中医院各 200 万，广东药科大学、南方医科大学各 100 万，总计专项经费 800 万元。资金分配方法：其他（补助性资金）。

### **(21) 面上科研项目**

开展中医药面上科研课题研究项目。

组织开展中医药（中西医结合）基础、临床和中药研究，为保障人民健康和社会经济发展服务。资助面上中医药科研课题资金，总计安排 300 万元。资金分配方法：项目制。

### **(22) 重点科研项目**

重点针对严重影响我省人民健康的重大疾病、疑难疾病、常见病、多发病的中医药防治，开展重点科学研究，总计安排 210 万元。资金分配方法：项目制。

### **（23）单方验方科研项目**

挖掘、整理、研究中药单方验方、中医药特色技术和方法，提高中医药临床疗效。总计安排 250 万。资金分配方法：项目制。

### **（24）对外交流与合作**

为主动融入国家“一带一路”建设，推动我省中医药“走出去”。安排粤港澳大湾区 20 万元；4 家地市中医药文化传播基地每个 15 万，共 60 万，总计安排专项经费 80 万元。资金分配方法：其他。

### **（25）省级中医药宣传平台**

利用省级网络技术平台的技术和信息优势，加强中国中医药报广东记者站和“广东中医药”微信公众号宣传平台建设，开展中医药专项宣传工作，总计安排专项经费 170 万元。资金分配方法：其他（委托）。

### **（26）中医药科普宣传**

积极开展中医药科普宣传，扩展中医药影响力。安排编写出版《中医药文化进校园系列丛书》、制作国医大师、省名中医影像以及中医中药中国行等活动项目总计 250 万元。资金分配方法：其他（委托）。

### **（27）中医药文化宣传教育基地建设**

按照国家中医药管理局中医药文化宣传教育基地标准，开展省级中医药文化宣传教育基地建设。共安排建设 3 个国家级基地，每个 20 万共 60 万；建设 10 个省级基地，每个 10 万共 100 万，总计 160 万。资金分配方法：项目制。

### **（28）中医药建设专项资金相关项目（共包括 5 个子项目）**

#### **（28-1）科教评审、检查业务**

中医药建设专项资金相关项目科教评审、检查业务项目 70 万元。资金分配方法：其他（委托）。

#### **（28-2）中医药统计与信息化**

中医药建设专项资金相关项目中医药统计与信息化项目 40 万元。资金分配方法：其他（委托）。

#### **（28-3）传统医学师承和确有专长人员医医师资格审核**



中医药建设专项资金相关项目传统医学师承和确有专长人员医师资格考核项目 30 万元。资金分配方法:其他(委托)。

#### **(28-4) 广东省中医医术确有专长医师资格考核项目**

中医药建设专项资金相关项目广东省中医医术确有专长医师资格考核项目 160 万元。资金分配方法:其他(委托)。

#### **(28-5) 依法行政等其他管理工作**

中医药建设专项资金相关项目其他管理项目 548 万元。

#### **(29-33) 岭南中药材保护项目**

省政府明确岭南中药材保护项目。安排中药材文化保护专用经费 200 万元;动态保护专项经费 50 万元;生产基地评估专项经费 80 万元;资源动态监测专项经费 120 万元;人才培养专项经费 50 万元,总计 500 万元。资金分配方法:其他(省政府明确项目)。

### **(二) 项目实施主要内容及实施程序**

#### **1、 绩效评价工作评价方案**

##### **(1) 评价工作整体规划及流程设计**

本项目评价工作整体流程如下图 3-1 所示,其主要步骤及内容说明如下。

第 1 步:前期准备。前期准备包括确定绩效评价任务和评价组织实施模式、编制评价任务大纲等。

第 2 步:评价设计。根据评价任务大纲设计详细的评价实施方案,包括设计准备、设计绩效评价框架及设计评价实施方案,评价实施方案包括确定证据收集方法,确定评价人员、时间和经费安排等。

第 3 步:评价实施。按照设计的方案开展绩效评价,包括项目自评报告准备、收集整理、数据分析、绩效初评、专家书面复评、项目分类及现场考查抽样、现场考查与评审、绩效终评、形成评价综合结论及总结经验和教训等。

第 4 步:报告评价结果。编写绩效评价报告,在此过程中多次与项目承办单位和负责人进行沟通,并将他们的观点和意见吸收到评价报告中来。

第 5 步:评价结果使用和发布。项目管理部门利用评价结果,用于解决问题、改进管理或为决策提供依据。财政部门将评价结果与以后年度的预算安排进行挂

钩。

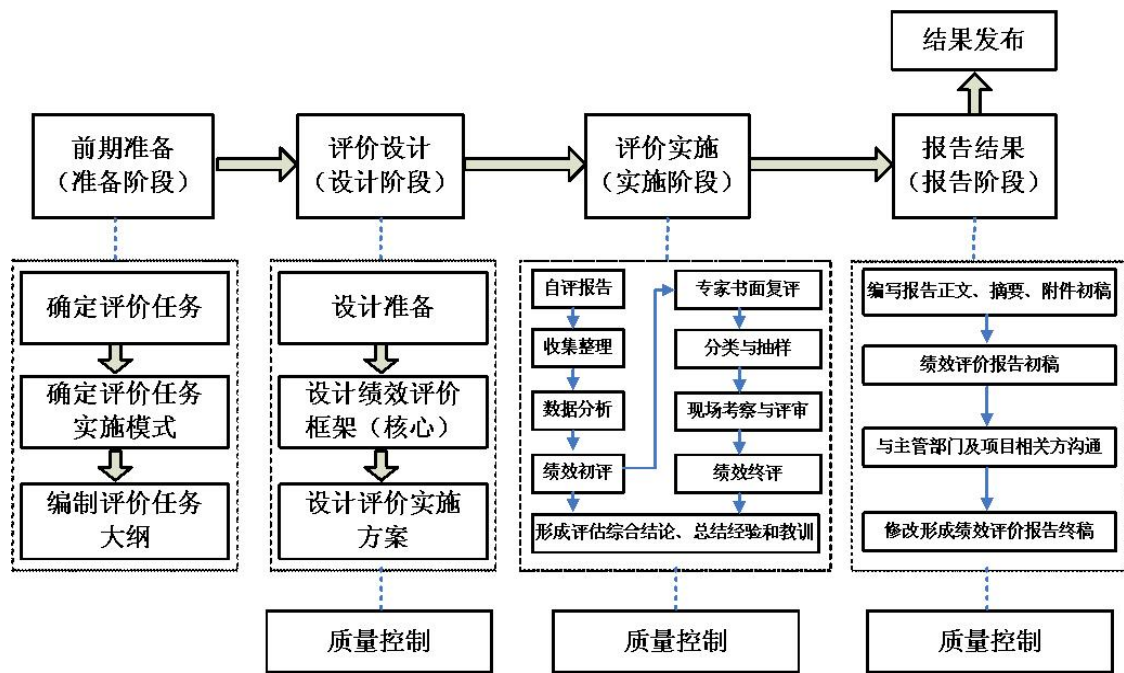


图 3-1 评价工作整体流程图

## (2) 评价工作组织设计

本项目评价任务由省中医药局规财（人事）处具体组织实施，本项目组织由评估领导小组、评估专家组、评估工作小组等三部分组成。

各小组主要组成人员及职责如下：

### 1) 评估领导小组组成及职责

评估领导小组由省中医药局各处室负责人和项目经办同志组成，其主要职责包括：

①审核、批准评价实施方案（包括专家组成员、工作组成员、评估工作计划等）、评价指标体系等内容；

②监督评价活动的进展并进行质量控制，对评价活动中出现的情况及时做出决策，为评价活动提供必要的支持；

③审核项目绩效初评及终评结果，检查评价报告初稿是否符合合同和《服务方案》的要求，对评价报告初稿提出反馈意见；

④审核批准评价报告终稿；

⑤决定评价结果的使用和发布。

### 2) 评估专家组组成及职责

评估专家组主要由广东省中医药局及项目承担单位推荐的熟悉中医药领域相关知识、具有一定项目评审经验的具有高级职称的专家组成，其主要职责包括：

①协助审定评价指标体系相关指标标准；

②参与审核项目绩效初评结果，参与确定复评项目，并负责对复评项目进行书面评审；

③参与复评项目的现场考察与评审；

④参与评价报告初稿的审核，并提出反馈意见；

⑤参与评价报告终稿的审核，对评价结果的使用和发布提出意见或建议。

### 3) 评估工作小组组成及职责

评估工作小组成员主要是广州中医药大学经济与管理学院的教师及部分合作医院的业务骨干。评价小组成员不得与项目管理、实施、运行等有利益冲突。评估工作小组成员通过培训应具备的主要能力条件包括：具有较为深厚的绩效评价知识和技能；熟悉被评项目所在领域的相关政策、技术、管理等知识；具有较强责任心等。其主要职责包括：

①编制评价方案，设计评价指标体系（一般不少于四级指标体系），设计评价过程有关文件，协助编制评价相关工作的汇报材料；

②与管理部门及被评价项目单位沟通，收集、分类、整理申报文件（包括自评报告）；

③编制评价会议计划，组织评审会议，协助评价专家采集评价有关基础数据，协助评价专家对自评材料等要件进行审查；协助评价专家编制评审有关报告；

④安排评价会场、专家及工作人员食宿，接送专家及工作人员等评价会议组织工作；

⑤向采购人提交评价过程所有工作报告，根据采购人要求进行各项数据分析，编写评价报告并负责报告最终定稿。

⑥起草中选项目合同、资料归档、与后续跟踪管理单位交接等后续相关工作。

### 4) 制定相关评审方案。

根据了解的项目情况及主要项目资料，对项目进行必要的研究和分析，掌握项目的预期目标和特点，制定切实可行的评审方案，包括：项目工作组初评方案、

复评方案、现场评价方案等。

5) 小组成员培训。

为指导项目组成员配合做好本次评价工作,本所将根据省中医药局的要求和项目的评价重点,组织学习完成评价过程中涉及的相关规定办法、资金文件、实施方案以及工作纪律,并在此基础上设置和完善各类工作底稿,为实施阶段做好充足的准备。

## 2、 2018 年省医疗卫生健康事业发展专项资金（传承发展中医药事业）项目绩效目标

### (1) 项目绩效总目标

通过专项资金的扶持,引导地方资金加大对中医药事业的投入,积极发挥中医药在深化医改中的作用,推进我省中医药事业的发展。一方面进一步健全中医药服务体系,全面提升中医药服务能力,培育名院、名科和名医,推动中医药医、产、学、研等关键领域取得重点突破,推进中医药强省建设。另一方面改善各级各类中医机构服务环境和服务条件,加强中医药科研和人才培养,推广中医药适宜技术,加强中医药文化建设,增强中医药特色优势,提升中医药服务能力,提高中医药服务水平。

### (2) 各类子项目绩效目标及其实际完成情况

表 1 各子项目绩效目标

序号	资金项目	绩效目标	绩效指标预期值	绩效指标实际值
1	省级中医院设备及修缮	常规性拨款项目,用于省级中医医院设备及修缮项目。	支持3家省属中医医院基础设施修缮,设备购置。	3所省属中医医院均完成基础设施修缮及设备购置。完成率100%。
2	省市级中医院建设	省级、地市级中医院改造升级建设。	安排3家未达三级中医院建设标准的省级、地市级中医院改造升级建设。	项目建设周期为3年,各单位均按计划进度建设中。
3	中医药信息化规划能力及应用水平建设	加强中医药信息化能力水平。	开展全省中医医院“互联网+医疗健康”专题培训班,建设广东省中医药建设项目专项资金监控与绩效评价系统	已完成集中专题培训和2所县级中医院相关项目的建设;系统已于2019年中旬上线,计划年底验

序号	资金项目	绩效目标	绩效指标预期值	绩效指标实际值
			和支持2家县级中医医院开展信息化项目建设。	收。完成率100%。
4	中医院治未病中心(平台)建设	推进全省中医预防保健服务体系建设工作。加强省级中医“治未病”指导中心的建设工作;支持各级中医医院建设治未病服务平台,带动发展区域治未病服务。	安排省5家省属中医医院“治未病”指导中心的建设和发展;安排26家中医医院治未病平台建设。	项目建设周期为2年。5家省属中医医院“治未病”指导中心,21家中医医院治未病平台按时开展项目建设。
5	全省中医药适宜技术网络视频平台建设	实现全省中医药适宜技术网络视频平台全覆盖,加强基层常见病多发病中医药适宜技术推广视频网络平台与基地建设。	安排3个省级基地进行基地运营维护;支持23个县级中医院的基地建设(包括两个无县级地市)。	2个省级基地完成中医药适宜技术推广任务,完成率66.67%;20个县级项目单位网络视频平台功能齐全,能满足推广示教的要求。项目单位能够提供中医药适宜技术种类仍需加强建设。完成率86.96%。
6	全省中医类别医师资格实践技能考试片区基地建设	落实国家医师资格考试改革的工作要求。	建设4个全省中医类别医师资格实践技能考试片区基地。	4个全省中医类别医师资格实践技能考试片区基地建设完成。完成率100%。
7	综合医院中医药工作示范单位	发挥综合医院中医示范单位的典型引领作用,加强综合医院中医药服务能力,促进综合医院中医药工作水平的整体提升。	安排5家综合医院中医药工作示范单位建设。	1家医院完成建设,3家医院正在建设中,1个项目未按要求上报自评材料。完成率20%。
8	中药特色技术传承人才培养	保存和发展中药特色优势,促进中药与中医的协调发展。	培养20名纳入中药特色技术传承人才培养项目的传承人。	19名继承人基本完成项目培训要求,掌握程度教优,1名继承人未

序号	资金项目	绩效目标	绩效指标预期值	绩效指标实际值
				完成游学轮转。 完成率 95%。
9	县区级中医临床技术骨干培训	开展县区级中医临床技术骨干培训。	依托6家省属中医医院每家医院每年开展一期临床应用技术培训,每期培训70人,共计培训420人。	6个项目,总共培训400人,总培训周期为25天。培训人数完成率95%。
10	国医大师学术思想传承	深入开展国医大师学术经验传承工作。	安排3个国医大师传承工作室建设。	已完成。完成率100%。
11	全国名中医传承工作室建设	进一步做好名老中医药专家学术思想传承工作,培养高层次中医临床和科研人才,提高中医药学术水平。	安排我省4名全国名中医学术思想传承工作室建设。	项目建设周期为3年,3个项目已完成,1项目正在建设中。
12	传染病中医药防治研究	充分发挥中医药防治传染病的特色和作用,推动中医药防治传染病重点研究室建设,开展中医药防治突发、新发传染病工作,提升中医药对突发、新发传染病的防治能力。	依托我省的2家国家中医药管理局中医药防治传染病重点研究室(广东省中医院、广州市第八人民医院)开展对新发、突发传染性疾病的中医药防治研究工作。	已完成。完成率100%。
13	第六批全国老中医药专家师承项目继承人经典理论培训	通过组织继承人参加集中理论培训,学习中医典籍、经方、中药实践技能等内容,提升继承人的理论水平和临床技能	培训继承人94人。	培训继承人93人,培训周期为4天。完成率99%。
14	全国基层名老中医药专家传承工作室继承人集中理论培训	组织继承人参加集中理论培训,学习中医典籍、经方、中药实践技能等内容,提升基层中医药人员的理论水平和临床技能,提升基层中医药服务能力。	培训继承人70人。	培训继承人125人,培训周期为5天。完成率100%。
15	中医药管理	提高我省中医药管理	组织两期培训班,每	完成率100%。

序号	资金项目	绩效目标	绩效指标预期值	绩效指标实际值
	机构人才及中医院管理人才培训	机构及公立中医医院管理人员的综合管理素养和管理能力。	个班次不少于 25 人，每期培训时间不少于 5 天、32 个学时	
16	中医住院医师（全科医生）规范化培训师资培养	强化中医临床思维和中医全科医学服务理念、服务模式，满足基层群众对中医全科医生服务的需求。	培训 200 名中医类别全科医生师资。	培训医师 200 人，培训周期为 6 天。完成率 100%。
17	第三批省名中医师承	加强省名中医的临床经验和学术思想的传承工作	①安排 50 名指导老师和 100 名传承人； ②委托广州中医药大学继续教育学院管理第三批师承项目以及承办培训班。	项目建设周期为 3 年，①81 名继承人按时按质完成继承工作； ②现已培训人数 103 人，培训周期 4 天。
18	省名中医传承工作室建设	推进中医药专家学术传承工作	支持 2018 年新遴选 40 位省中医药名专家建立工作室，合并安排 2017 年立项的 40 个工作室持续发展。	项目建设周期为 3 年，42 个项目单位已完成建设；35 个项目单位正在建设中。3 家单位未按时上报自评材料。
19	省名中医工作津贴	省名中医工作津贴。	发放 80 位省名中医工作津贴。	完成率 100%。
20	中医药创新研究中心建设	以推进中医药科学研究、加强中医药协同创新、建设一支高水平的中医药队伍。	建设 3 个中医药创新研究中心、5 个项目单位。	5 个项目单位均已完成建设。完成率 100%。
21	面上科研项目	开展中医药（中西医结合）基础、临床和中药研究，为保障人民健康和社会经济发展服务。	开展中医药面上科研课题研究。	项目建设周期为 2 年，按计划进度开展研究工作。
22	重点科研项目	重点针对严重影响我省人民健康的重大疾病、疑难疾病、常见病、多发病的中医药防治。	开展中医药重点科学研究。	项目建设周期为 2 年，按计划进度开展研究工作。

序号	资金项目	绩效目标	绩效指标预期值	绩效指标实际值
23	单方验方科研项目	挖掘、整理、研究中药单方验方、中医药特色技术和方法，提高中医药临床疗效。	开展单方验方科研。	项目建设周期为2年，按计划进度开展研究工作。
24	对外交流与合作	为主动融入国家“一带一路”建设，推动我省中医药“走出去”。	①安排粤港澳大湾区会议； ②安排4家地市中医药文化传播基地建设。	①粤港澳大湾区会议完成。完成率100%。 ②项目建设周期为3年，4个项目单位完工率均符合进度。完成率100%。
25	省级中医药宣传平台	强化中医药宣传人才队伍建设，丰富宣传手段，提高宣传质量，进一步宣传岭南中医药历史文化和中医药强省建设成效，不断提升广东中医药工作社会影响力。	利用省级网络技术和信息优势，加强中国中医药报广东记者站和“广东中医药”微信公众号宣传平台建设，开展中医药专项宣传工作。	按计划完成。完成率100%。
26	中医药科普宣传	积极开展中医药科普宣传，扩展中医药影响力。	出版《中医药文化进校园系列丛书》、制作国医大师和省名中医影像以及中医中药中国行活动项目	按计划完成。完成率100%。
27	中医药文化宣传教育基地建设	开展省级中医药文化宣传教育基地建设。	建设3个国家级基地和10个省级基地。	9个基地按时建成，并开展相应的宣传活动。完成率69.23%。
28-1	科教评审、检查业务	促进我省中医药科教工作发展，完成相关的检查评估工作。	委托7个项目单位进行中医药科研项目管理 and 中医药教育项目管理。	均已完成。完成率100%。
28-2	中医药统计与信息化	切实加强我省中医医疗资源与服务能力统计工作和省中医药局机关信息化工作。	开展好中医医疗资源与服务调查统计，编印《广东省中医统计信息汇编》，同时保障好局机关信息	按计划完成。完成率100%。



序号	资金项目	绩效目标	绩效指标预期值	绩效指标实际值
			化水平与工作正常动作。	
28-3	传统医学师承和确有专长人员医师资格考核	做好2018年我省组织开展传统医学师承和确有专长人员医师资格考核考试工作。	组织开展传统医学师承和确有专长人员医师资格考核考试工作。	确有专长人员考试项目已按计划完成。完成率100%。
28-4	广东省中医医术确有专长医师资格考核项目	做好2018年广东省中医医术确有专长医师资格考核工作。	组织开展广东省中医医术确有专长人员医师资格考核注册管理工作。	已完成。完成率100%。
28-5	依法行政等其他管理工作	维护局机关日常行政运营。	维护局机关日常行政运营。	按计划完成。
29	动态保护	岭南中药材保护专项。	2017年至2021年，每年提出不少于3种符合岭南道地特征、急需保护的中药材品种及其可操作性的保护方案，并纳入《广东省岭南中药材保护条例》进行管理。	已提出12种符合要求的中药材品种，并启动相关管理程序。完成率100%。
30	人才培养	岭南中药材保护专项。	编写8个保护品种系列培训教材、组织举办中药材保护培训班、组织专家开展产地指导等内容。	已编写8本大纲和教材，组织培训65人，开展4次培训班。完成率100%。
31	生产基地评估	岭南中药材保护专项。	实地调研4个岭南中药材生产基地；开展外省中药道地药材生产基地考察交流；完成生产机地评估标准的制定。	项目建设周期为2年，已完成3个基地的实地调研，完成生产机地评估标准的草稿。
32	文化保护	岭南中药材保护专项	编撰1套丛书或者开发1种相关文创产品；举办1次相关精品展览；举办1次品种保护交流文化节；建设品种保护宣传	开发1种相关文创产品；已建设品种保护宣传网络平台；已拍摄岭南中药文化保护相关纪录片；

序号	资金项目	绩效目标	绩效指标预期值	绩效指标实际值
			网络平台；拍摄岭南中药文化保护相关纪录片；举办1次文化科普宣教活动。	举办6次文化科普宣教活动。完成率66.67%。
33	资源动态监测	岭南中药材保护专项	建成中药资源动态监测信息管理系统；能够提供8个保护品种中药材的动态监测信息；开展8个品种的调查研究和相关监测技术人员技术培训。	中药资源动态监测信息管理系统正在建设中。完成率75%。

### (三) 项目评价情况简述

#### 1 项目自评情况

根据《关于做好2018年省医疗卫生健康事业发展专项资金（传承发展中医药事业）项目绩效评价工作的通知》（粤中医办函〔2019〕86号）中对各到位项目的自评工作要求，评价工作小组于2019年7月31日-8月15日在广东省省级中药建设专项资金监控与绩效评价系统中收集和整理了各项目承担单位自行提交的自评材料，并对上报的相关自评材料进行资料完整性、真实性审核，统计及分析。资金使用单位自评汇总情况详见下表2。

表2 资金使用单位自评情况汇总表

序号	资金项目	资金 (万元)	项目数 (个)	自评单位 (个)	自评率 (%)
1	省级中医院设备及修缮	6631	3	3	100
2	省市级中医院建设	3000	3	3	100
3	中医药信息化规划能力及应用水平建设	277	4	4	100
4	中医院治未病中心（平台）建设	3100	31	29	93.55
5	全省中医药适宜技术网络视频平台建设	1070	26	22	84.62

6	全省中医类别医师资格实践技能考试片区基地建设	400	4	4	100
7	综合医院中医药工作示范单位	250	5	5	100
8	中药特色技术传承人才培养	60	20	20	100
9	县区级中医临床技术骨干培训	60	6	6	100
10	国医大师学术思想传承	75	3	3	100
11	全国名中医传承工作室建设	200	4	4	100
12	传染病中医药防治研究	40	2	2	100
13	第六批全国老中医药专家师承项目继承人经典理论培训	17	1	1	100
14	全国基层名老中医药专家传承工作室继承人集中理论培训	18	1	1	100
15	中医药管理机构人才及中医院管理人才培养	30	1	0	0
16	中医住院医师（全科医生）规范化培训师资培养	60	1	1	100
17	第三批省名中医师承	330	51	48	94.12
18	省名中医传承工作室建设	800	80	77	96.25
19	省名中医工作津贴	80	80	80	100
20	中医药创新研究中心建设	800	7	7	100
21	面上科研项目	300	300	292	97.33
22	重点科研项目	210	19	18	94.74
23	单方验方科研项目	250	19	17	89.47
24	对外交流与合作	80	5	4	80
25	省级中医药宣传平台	170	2	1	50
26	中医药科普宣传	250	1	1	100
27	中医药文化宣传教育基地建设	160	13	13	100
28-1	科教评审、检查业务	70	7	7	100
28-2	中医药统计与信息化	40	1	1	100

28-3	传统医学师承和确有专长人员 医医师资格考核	30	1	1	100
28-4	广东省中医医术确有专长医师 资格考核项目	160	1	1	100
28-5	依法行政等其他管理工作	548	1	1	100
29	动态保护	50	1	1	100
30	人才培养	50	1	1	100
31	生产基地评估	80	1	1	100
32	文化保护	200	1	1	100
33	资源动态监测	120	1	1	100
合计		20066	707	682	96.32

## 2、项目评价分数和等级情况

### (1) 项目初评情况

项目绩效评价小组收集和整理各地区、各单位子项目负责人递交的项目自评材料，并在此基础上组织专家初评。专家初评工作于2019年8月2日开始到8月15日结束，共组织11位专家对2018年中医药建设专项共33大类194个资金使用单位370个项目进行了专家初评，专家由从事中医药管理研究或实践工作10年或以上人员组成，初评专家名单见附录1。采用的方式是每个项目由2位专家进行背对背评价，取2位专家平均得分作为该项目初评得分。根据《省级财政到期资金使用绩效评价暂行办法》（省财评〔2014〕7号）要求，评价结果分为优、良、中、合格、差五个等级，其中100-90分为优；89-80分为良；79-70为中；69-60为合格；59分以下为差。同时根据《广东省财政厅广东省审计厅关于省级财政科研项目资金的管理监督办法》的通知粤财规〔2019〕5号，第四十一条，省项目主管部门可委托项目管理专业机构或具有资质的第三方中介机构，严格依据任务书在项目实施期末进行一次综合性绩效评价。面上科研项目、重点科研项目和单方验方科研项目三类项目不属于实施期末，暂时不参与绩效评价。

2018年项目专家初评分数由同类所有项目专家评分的平均分得出，在33类37项目中，其中优的项目有21个，结果为良的项目有9个，结果为中的项目有

4个，不参与初评的项目有3个，无不合格项目。具体情况详见表3。

表3 项目专家初评结果情况汇总表

序号	资金项目	初评分数	初评等级
1	省级中医院设备及修缮	96.75	优
2	省市级中医院建设	91.00	优
3	中医药信息化规划能力及应用水平建设	88.24	良
4	中医院治未病中心（平台）建设	88.53	良
5	全省中医药适宜技术网络视频平台建设	78.82	中
6	全省中医类别医师资格实践技能考试片区基地建设	92.88	优
7	综合医院中医药工作示范单位	85.27	良
8	中药特色技术传承人才培养	88.47	良
9	县区级中医临床技术骨干培训	91.90	优
10	国医大师学术思想传承	91.57	优
11	全国名中医传承工作室建设	96.31	优
12	传染病中医药防治研究	90.65	优
13	第六批全国老中医药专家师承项目继承人经典理论培训	98.75	优
14	全国基层名老中医药专家传承工作室继承人集中理论培训	98.00	优
15	中医药管理机构人才及中医院管理人才培训	99	优
16	中医住院医师（全科医生）规范化培训师资培养	99.50	优
17	第三批省名中医师承	85.61	良
18	省名中医传承工作室建设	80.96	良
19	省名中医工作津贴	100	优
20	中医药创新研究中心建设	88.10	良
21	面上科研项目	不参与	不参与

22	重点科研项目	不参与	不参与
23	单方验方科研项目	不参与	不参与
24	对外交流与合作	93.75	优
25	省级中医药宣传平台	85	良
26	中医药科普宣传	95	优
27	中医药文化宣传教育基地建设	90.18	优
28-1	科教评审、检查业务	93.58	优
28-2	中医药统计与信息化	93.5	优
28-3	传统医学师承和确有专长人员医师资格考核	92.15	优
28-4	广东省中医医术确有专长医师资格考核项目	92.95	优
28-5	依法行政等其他管理工作	100	优
29	动态保护	92.60	优
30	人才培养	79.00	中
31	生产基地评估	73.50	中
32	文化保护	85.20	良
33	资源动态监测	71.00	中

## (2) 项目现场评审

现场评价项目确定主要依据广东省人民政府《关于印发广东省省级财政专项资金管理试行办法的通知》（粤府〔2016〕86号），单个项目500万元（含500万元）以上的专项资金进行评价；单个项目500万元以下抽查不低于10%的项目实施重点评价。结合专家的意见，评价单个项目500万元（含500万元）以上的专项资金，此外，对专家初评结果为优秀项目 and 不合格项目进行重点评价。

2019年9月2日省中医药局印发《关于开展2018年度广东省医疗卫生健康事业发展专项资金（传承发展中医药事业）现场绩效评价工作的通知》（粤中医办函〔2019〕102号）。现场评价方案在综合考虑了2018年中医药建设专项项目分布、资金数量和初审考评等情况，确定了25类项目、21个地市共92个项目进行现场绩效评价，涉及资金总额13056万元，占2018年专项资金的

65.07%，并重点检查资金支付情况、支出合规性、支出结构及产出效益等内容，形成评估综合结论。2019年9月5日开始，截至2019年9月17日，省中医药局共安排了8组专家对上述项目进行了现场绩效评价，现场评价专家名单见附录2，现场评价考察情况安排见附录3。专家组由相关领域技术专家和财务专家组成，采取现场座谈会、答辩会的形式，实地查看项目实施情况和核查该项目实施过程中产生的相关资料，对自评材料反馈信息的真实性、准确性和全面性等进行深入而具体的了解与核实，形成现场评价意见。专家现场评价的25类92个项目，最终结果为：优45个（48.92%）、良5个（5.44%）、中16个（17.4%）、合格15个（16.31%）、差9个（9.79%）、暂不参与评价2个（2.17%）。暂不参与评价的两个项目是由于原中医院合并到人民医院，新的中医院在规划建设中，没有开始建设适宜技术平台，属于政策性改变产生不可抗力因素。现场绩效评价情况详见表4-1和4-2。

表4-1 现场评价项目明细表

编号	资金项目名称	项目数 (个)	抽查数 (个)	抽查率 (%)
1	省级中医院设备及修缮	3	3	100
2	省市级中医院建设	3	3	100
3	中医药信息化规划能力及应用水平建设	4	1	25
4	中医院治未病中心（平台）建设	31	16	51.61
5	全省中医药适宜技术网络视频平台建设	26	12	46.15
6	全省中医类别医师资格实践技能考试片区基地建设	4	2	50
7	综合医院中医药工作示范单位	5	2	40
8	中药特色技术传承人才培养	20	1	5
9	县区级中医临床技术骨干培训	6	2	33.33
10	国医大师学术思想传承	3	1	33.33
11	全国名中医传承工作室建设	4	2	50
12	传染病中医药防治研究	2	1	50

13	第六批全国老中医药专家师承项目继承人经典理论培训	1	1	100
14	全国基层名老中医药专家传承工作室继承人集中理论培训	1	1	100
15	中医药管理机构人才及中医院管理人才培训	1	1	100
16	中医住院医师（全科医生）规范化培训师资培养	1	1	100
17	第三批省名中医师承	51	10	19.61
18	省名中医传承工作室建设	80	18	22.5
20	中医药创新研究中心建设	7	1	14.29
24	对外交流与合作	5	2	40
25	省级中医药宣传平台	2	1	50
27	中医药文化宣传教育基地建设	13	6	46.15
28-1	科教评审、检查业务	7	2	28.57
35	生产基地评估	1	1	100
37	资源动态监测	1	1	100
合计		282	92	32.62

表 4-2 现场评价项目情况汇总

序号	资金项目名称	项目单位	初评综合得分	现场评价等级
1	省级中医院设备及修缮	广东省中医院	97.5	优
		广州中医药大学第一附属医院	97	优
		广东省第二中医院	95.75	优
2	省市级中医院建设	广州中医药大学第三附属医院	93.75	良
		湛江市第一中医院	90.75	优
		潮州市中医院	88.5	优
3	中医药信息化规划能力及应用水平建设	江门市五邑中医院恩平分院	94	优



4	中医院治未病中心 (平台)建设	广东省中医院	100	优
		广东省中医院珠海医院	100	优
		广东省第二中医院	98.25	优
		海珠区中医医院	98.25	优
		龙岗区中医院	97.75	优
		广州中医药大学第一附属医院	97.35	优
		广州市正骨医院	97	优
		梅州市中医院(田家炳医院)	97	优
		东莞市虎门中医院	95.8	优
		仁化县中医院	95.55	优
		广州中医药大学第三附属医院	95.35	优
		曲江区中医院	61.75	合格
		清新区中医院	-	暂不参与评价
		连南瑶族自治县中医院	-	暂不参与评价
		陆丰市中医院	-	合格
		陆河县中医院	-	差
5	全省中医药适宜技术 网络视频平台建设	广东省中医院	97.5	优
		中山市中医院	94.55	优
		清新区人民医院	78.8	合格
		连南瑶族自治县人民医院	74	合格
		连山壮族瑶族自治县人民医院	57.8	中
		阳东区人民医院	50.25	差
		江城区人民医院	48.75	差
		云安区人民医院	—	合格
		云城区腰古中心卫生院	—	差
		城区红草中心卫生院	—	中
		龙湖人民医院	—	中

		榕城区梅云社区卫生服务中心	—	中	
6	全省中医类别医师资格实践技能考试片区基地建设	湛江中医学校	95.5	优	
		江门市中医药高等职业学院	95	优	
7	综合医院中医药工作示范单位	广州市第八人民医院	100	优	
		中山大学附属第一医院	—	中	
8	中药特色技术传承人培训	广州市中医医院	96.5	优	
9	县区级中医临床技术骨干培训	广州中医药大学第一附属医院	97.8	优	
		广东省中医院	95	优	
10	国医大师学术思想传承	广州中医药大学第一附属医院 (周岱翰)	94.6	优	
11	全国名中医传承工作室建设	广东省中医院	林毅	100	优
		广州中医药大学第一附属医院	欧阳惠卿	98.8	优
12	传染病中医药防治研究	广州市第八人民医院	92.55	优	
13	第六批全国老中医药专家师承项目继承人经典理论培训	广州中医药大学	98.75	优	
14	全国基层名老中医药专家传承工作室继承人集中理论培训	广州中医药大学	98	优	
15	中医药管理机构人才及中医院管理人才培训	中山大学	99	优	
16	中医住院医师(全科医生)规范化培训师资格培养	广东省中医院	99.5	优	

17	第三批省名中医师承	广州中医药大学	张忠德	97.8	优
		广州中医药大学继续教育学院	培训	95.4	优
		揭阳惠来县慈云中医院	胡水勋	89	中
		肇庆市中医院	吴社泉	85.45	良
		南山区人民医院	黄胜光	72.5	合格
		兴宁市中医院	杨郎	65.45	合格
		清远市妇幼保健院	曾宪进	63.5	合格
		中山大学	陈泽雄	-	差
		广东省妇幼保健院	刘颖	-	中
		中山大学	张诗军	-	差
18	省名中医传承工作室建设	清远市中医院	黄宗良	96	优
		揭阳市中医院	卢永兵	81	良
		中山市中医院	陈金泉	76	中
		河源市中医院	钟强	74.45	中
		广东省第二中医院	汪何	69.9	中
		惠州市中医院	陈洪	68.6	合格
		韶关市中医院	黄献民	68.35	中
		顺德区第一人民医院	龙倩玲	66.25	合格
		广东省第二中医院	许学猛	66.25	良
		韶关市粤北人民医院	饶振芳	65.7	良
		广东省第二中医院	谢波	65.2	中
		广东省第二人民医院	梁兆球	64.9	合格
		深圳市中医院	彭力平	64.2	合格
		茂名市中医院	黎治荣	64.1	差
		潮州市中医院	林汉森	56	差
		海丰县中医院	柯青	-	合格
广东医科大学附属医	莫通	-	中		

		院			
		茂名市中医院	张帆	-	差
20	中医药创新研究中心建设	广东药科大学（郭姣）		90.5	中
24	对外交流与合作	广州白云山和记黄埔中药有限公司神农草堂中医药博物馆		100	优
		人之初杂志社		-	合格
25	省级中医药宣传平台	中国中医药报记者站		-	中
27	中医药文化宣传教育基地建设	广州白云山中一药业有限公司		100	优
		湛江市卫生健康局		99	优
		惠州市卫生健康局		97	优
		阳春市中医院		95	优
		南寿峰健康产业园		96.5	优
		广东太安堂药业股份有限公司		96.5	优
28-1	科教评审、检查业务	佛山市中医院		98.8	优
		广东省中医院		97	优
35	生产基地评估	广东省第二中医院		73.5	合格
37	资源动态监测	广州中医药大学		71	中

### （3）项目综合评价

评价小组对资金使用情况进行属地分类、评价指标分类等多重维度分析，对前期准备、资金管理、组织实施和项目绩效情况进行全面综合评价，并通过对自评得分、专家初评得分和现场评价得分进行对比分析后，综合认定专项资金项目的最终绩效等级。绩效综合评价结果分级严格按照《省级财政到期资金使用绩效评价暂行办法》（省财评〔2014〕7号）的要求。2018年省医疗卫生健康事业发展专项资金（传承发展中医药事业）项目的绩效最终评定分数为89.84分，等级为“良好”。其中中医药专项建设工作方向中**所有项目**最终等级均为优，中医药服务体系建设方向中**66.7%**（2/3）项目为优，中医药服务能力建设方向中**25%**（1/4）项目为优，中医药人才建设及传承创新方向中**61.5%**（8/13）项目为优，中医药文化与对外合作交流方向中**50%**（2/4）项目为优，岭南中药材保护方向

中 25% (1/4) 项目为优，具体结果详见表 5 (1-33)。

表 5 2018 年省医疗卫生健康事业发展专项资金  
(传承发展中医药事业) 项目的绩效最终评定情况

隶属方向	项目编号	资金项目	最终等级
中医药服务体系 建设	1	省级中医院设备及修缮	优
	2	省市级中医院建设	优
	3	中医药信息化规划能力及应用 水平建设	良
中医药服务 能力建设	6	全省中医类别医师资格实践技 能考试片区基地建设	优
	4	中医院治未病中心(平台)建设	良
	7	综合医院中医药工作示范单位	良
	5	全省中医药适宜技术网络视频 平台建设	中
中医药人才 建设及传承 创新	19	省名中医工作津贴	优
	16	中医住院医师(全科医生)规范 化培训师资培养	优
	13	第六批全国老中医药专家师承 项目继承人经典理论培训	优
	14	全国基层名老中医药专家传承 工作室继承人集中理论培训	优
	11	全国名中医传承工作室建设	优
	9	县区级中医临床技术骨干培训	优
	10	国医大师学术思想传承	优
	12	传染病中医药防治研究	优
	8	中药特色技术传承人才培训	良
	20	中医药创新研究中心建设	良
	17	第三批省名中医师承	良

	18	省名中医传承工作室建设	良
	15	中医药管理机构人才及中医院 管理人才培养	优
	21	面上科研项目	不参与
	22	重点科研项目	不参与
	23	单方验方科研项目	不参与
中医药文化 与对外合作 交流	24	对外交流与合作	优
	27	中医药文化宣传教育基地建设	优
	25	省级中医药宣传平台	良
	26	中医药科普宣传	优
中医药专项 建设工作	28-5	广东省中医药局	优
	28-1	科教评审、检查业务	优
	28-3	传统医学师承和确有专长人员 医医师资格考核	优
	28-4	广东省中医医术确有专长医师 资格考核项目	优
	28-2	中医药统计与信息化	优
岭南中药材 保护	29	动态保护	优
	30	文化保护	良
	31	人才培养	中
	32	生产基地评估	合格
	33	资源动态监测	中
合计			良

经绩效评价小组专家论证，现将最终评价等级赋值如下：等级优为 95 分，等级良为 85 分，等级中为 75 分，等级合格为 65 分，等级差为 55 分。以此为依据最终评定 2018 年广东省医疗卫生健康事业发展专项资金（传承发展中医药事业）绩效评价项目最终得分为 84.33 分，等级为良。在 33 类 290 个项目中等级为优的有 105 项（36.2%）、等级为良的有 116 项（40%）、等级为中的有 42 项（14.4%）、等级为合格的有 15 项（5.1%）、等级为差的有 9 项（3.1%），特殊

原因暂时不参与评价 2 项 (0.7%)，无材料参与评价 1 项，具体情况详见附录 4。

各类项目具体综合评价情况汇总如下：

1) 省级中医院设备及修缮项目。

表 5-1 项目综合评价情况

项目总数 (个)	项目承担单位	初评综合得分	初评等级	现场评价等级	终评结果
3	广东省第二中医院	97.5	优	优	优
	广东省中医院	97	优	优	优
	广州中医药大学第一附属医院	95.75	优	优	优
合计		96.75	优	优	优

2) 省市级中医院建设项目

表 5-2 项目综合评价情况

项目总数 (个)	项目承担单位	初评综合得分	初评等级	现场评价等级	终评结果
3	湛江市第一中医院院	93.75	优	优	优
	潮州市中医院	90.75	优	优	优
	广州中医药大学第三附属医院	88.5	优	优	优
合计		91	优	优	优

3) 中医药信息化规划能力及应用水平建设项目

表 5-3 项目综合评价情况

项目总数 (个)	项目承担单位	初评综合得分	初评等级	现场评价等级	终评结果
4	广东省中医院	93	优	-	优
	广东省第二中医院	81.95	良	-	良
	普宁市中医院	84	优	-	优

	江门市五邑中医院恩平分院	94	优	优	优
	合计	88.24	良	良	良

4) 中医院治未病中心(平台)建设项目(分为省级“治未病”指导中心和县级中医医院“治未病”服务平台建设)

表 5-4 项目综合评价情况

项目总数 (个)	项目承担单位	初评综合得分	初评等级	现场评价等级	终评结果
5	广东省中医院	100	优	优	优
	广东省中医院珠海医院	100	优	优	优
	广东省第二中医院	98.25	优	优	优
	广州中医药大学第一附属医院	97.35	优	优	优
	广州中医药大学第三附属医院	95.35	优	优	优
	合计	98.19	优	优	优
26	广东省第二中医院黄埔医院	91.6	优	-	优
	海珠区中医医院	98.25	优	优	优
	龙岗区中医院	97.75	优	优	优
	广州市正骨医院	97	优	优	优
	梅州市中医院(田家炳医院)	97	优	优	优
	东莞市虎门中医院	95.8	优	优	优
	仁化县中医院	95.55	优	优	优
	天河区中医医院	94.25	优	-	优
	番禺区中医医院	94	优	-	优
	霞山区骨伤科医院	93.5	优	-	优



	端州区华佗医院	93	优	-	优
	始兴县中医院	92.8	优	-	优
	南沙区中医医院	91.95	优	-	优
	连山壮族瑶族自治县中医院	91.75	优	-	优
	阳江市中西医结合医院	91.65	优	-	优
	白云区中医医院	86.35	良	-	良
	饶平县中医院	83.5	良	-	良
	江海区中西医结合医院	83.45	良	-	良
	龙门县中医医院	82.5	良	-	良
	广东省中西医结合医院 (南海区中医院)	74.75	中	-	中
	廉江市中医院	72	中	-	中
	曲江区中医院	61.75	合格	合格	合格
	清新区中医院	—	—	暂不参与评价	暂不参与评价
	连南瑶族自治县中医院	—	—	暂不参与评价	暂不参与评价
	陆丰市中医院	—	—	合格	合格
	陆河县中医院	—	—	差	差
	合计	86.43	良	良	良

5) 全省中医药适宜技术网络视频平台建设项目 (分为省级平台和县级平台)

表 5-5 项目综合评价情况

项目总数 (个)	项目承担单位	初评综合得分	初评等级	现场评价等级	终评结果
3	广东省中医院	97.5	优	优	优

	广州中医药大学第一附属医院	94.4	优	-	优
	广东省第二中医院	90.85	优	-	优
	合计	94.25	优	优	优
23	中山市中医院	94.55	优	优	优
	湛江中医学校	94	优	-	优
	潮安区庵埠华侨医院	92.8	优	-	优
	武江区龙归镇中心卫生院	90	优	-	优
	仁化县人民医院	87.4	良	-	良
	东莞市中医院	86.6	良	-	良
	曲江区马坝镇卫生院	85.8	良	-	良
	坡头区人民医院	85.3	良	-	良
	濠江区珠浦医院	84.8	良	-	良
	清城区中医院	80.15	良	-	良
	浈江区犁市镇中心卫生院	79.3	中	-	中
	清新区人民医院	78.8	中	合格	合格
	南澳县人民医院	76.55	中	-	中
	连南瑶族自治县人民医院	74	中	合格	合格
	潮南区人民医院	71.9	中	-	中
	连山壮族瑶族自治县人民医院	57.8	差	中	中
	阳东区人民医院	50.25	差	差	差
	江城区人民医院	48.75	差	差	差
	榕城区梅云社区卫生服务中心	—	—	中	中
	云城区腰古中心卫生院	—	—	差	差
龙湖人民医院	—	—	中	中	
云安区人民医院	—	—	合格	合格	
城区红草中心卫生院	—	—	中	中	

合计	78.82	中	中	中
----	-------	---	---	---

6) 全省中医类别医师资格实践技能考试片区基地建设项目

表 5-6 项目综合评价情况

项目总数 (个)	项目承担单位	初评综合得分	初评等级	现场评价等级	终评结果
4	湛江中医学校	95.5	优	优	优
	江门市中医药高等职业学院	95	优	优	优
	嘉应学院医学院	93.8	优	-	优
	佛山市中医院	87.2	良	-	良
合计		92.88	优	优	优

7) 综合医院中医药工作示范单位项目

表 5-7 项目综合评价情况

项目总数 (个)	项目承担单位	初评综合得分	初评等级	现场评价等级	终评结果
5	广州市第八人民医院	100	优	优	优
	深圳市妇幼保健院	89.175	良	-	良
	中山市黄圃人民医院	80.9	良	-	良
	阳江市人民医院	71	中	-	中
	中山大学附属第一医院	-	-	中	中
合计		85.27	良	良	良

8) 中药特色技术传承人才培养项目

表 5-8 项目综合评价情况

项目总数 (个)	项目承担单位	初评综合得分	初评等级	现场评价等级	终评结果
-------------	--------	--------	------	--------	------

20	广州市中医医院	96.5	优	优	优
	肇庆市第二人民医院	94.5	优	-	优
	新会区中医院	92.05	优	-	优
	端州区华佗医院	92	优	-	优
	天河区中医医院	91.5	优	-	优
	深圳市中医院	91.5	优	-	优
	高明区中医院	90.5	优	-	优
	深圳市中医院	90.3	优	-	优
	江门中医药学校	90.05	优	-	优
	广州中医药大学	90.05	优	-	优
	广州中医药大学第一附属医院	89.85	良	-	良
	广东省中医院	89.5	良	-	良
	广州中医药大学第三附属医院	88	良	-	良
	广东省中医院	87.5	良	-	良
	佛山市中医院	87	良	-	良
	清远市中医院	86.85	良	-	良
	南方医科大学中西医结合医院	84.55	良	-	良
	广东省中西医结合医院(南海区中医院)	84.2	良	-	良
	广东省中西医结合医院(南海区中医院)	82.95	良	-	良
	广东药科大学	70	中	-	中
合计	88.47	良	良	良	

9) 县区级中医临床技术骨干培训项目

表 5-9 项目综合评价情况

项目总数 (个)	项目承担单位	初评综合得分	初评等级	现场评价等级	终评结果
6	广州中医药大学第一附属医院	97.8	优	优	优
	广东省中医院	95	优	优	优
	南方医科大学中西医结合医院	94	优	-	优
	广州中医药大学第三附属医院	89.5	良	-	良
	广东省第二中医院	89.5	良	-	良
	广东省中西医结合医院	85.5	良	-	良
合计		91.9	优	优	优

10) 国医大师学术思想传承项目

表 5-10 项目综合评价情况

项目总数 (个)	项目承担单位	工作室	初评综合得分	初评等级	现场评价等级	终评结果
3	广州中医药大学第一附属医院	周岱翰	94.6	优	优	优
		邓铁涛	87.1	良	-	良
	广东省中医院	禤国维	93	优	-	优
合计			91.57	优	优	优

11) 全国名中医传承工作室建设项目

表 5-11 项目综合评价情况

项目总数 (个)	项目承担单位	工作室	初评综合得分	初评等级	现场评价等级	终评结果
4	广东省中医院	林毅	100	优	优	优
		刘茂才	94.5	优	-	优

	广州中医药大学第一附属医院	欧阳惠卿	98.8	优	优	优
	广东省第二中医院	邱健行	91.95	优	-	优
合计			96.31	优	优	优

12) 传染病中医药防治研究项目

表 5-12 项目综合评价情况

项目总数 (个)	项目承担单位	初评综合得分	初评等级	现场评价等级	终评结果
2	广州市第八人民医院	92.55	优	优	优
	广东省中医院	88.75	良	-	良
合计		90.65	优	优	优

13) 第六批全国老中医药专家师承项目继承人经典理论培训项目

表 5-13 项目综合评价情况

项目总数 (个)	项目承担单位	初评综合得分	初评等级	现场评价等级	终评结果
1	广州中医药大学继续教育学院	98.75	优	优	优
合计		98.75	优	优	优

14) 全国基层名老中医药专家传承工作室继承人集中理论培训项目

表 5-14 项目综合评价情况

项目总数 (个)	项目承担单位	初评综合得分	初评等级	现场评价等级	终评结果
1	广州中医药大学继续教育学院	98	优	优	优
合计		98	优	优	优

15) 中医药管理机构人才及中医院管理人才培训项目

表 5-15 项目综合评价情况

项目总数 (个)	项目承担单位	初评综合得分	初评等级	现场评价等级	终评结果
1	中山大学	99	优	优	优
合计		99	优	优	优

16) 中医住院医师（全科医生）规范化培训师资培养项目

表 5-16 项目综合评价情况

项目总数 (个)	项目承担单位	初评综合得分	初评等级	现场评价等级	终评结果
1	广东省中医院	99.5	优	优	优
合计		99.5	优	优	优

17) 第三批省名中医师承项目

表 5-17 项目综合评价情况

项目总数 (个)	项目承担单位	指导老师	初评综合得分	初评等级	现场评价等级	终评结果
51	广州中医药大学	继续教育学院	95.4	优	优	优
		张忠德	97.8	优	优	优
		吴万垠	93.9	优	-	优
		艾宙	90.7	优	-	优
		范瑞强	90.7	优	-	优
		阮岩	89.5	良	-	良
		林定坤	89.5	良	-	良
	南方医科大学	贾钰华	93.25	优	-	优
		李娟	90.95	优	-	优
	梅州市第二中医医	温乃元	92.15	优	-	优

院					
广东省第二人民医院	刘浩	91.9	优	-	优
深圳市中医院	黄彬	91.35	优	-	优
	高雪	89.65	良	-	良
	周大桥	89.4	良	-	良
	李浩	84	良	-	良
	童光东	75.25	中	-	中
潮州市中医院	陈立生	90.5	优	-	优
广州市中西医结合医院	龙德	90.45	优	-	优
湛江市第二中医院	郑泽荣	90	优	-	优
	招仕富	83.1	良	-	良
广东省人民医院	黄松柏	89.45	良	-	良
	叶安娜	88.45	良	-	良
佛山市第二人民医院	张卫华	89.25	良	-	良
	李逸群	88.9	良	-	良
惠来县慈云中医院	胡水勋	89	良	中	中
黄埔区中医医院	郝建军	88.4	良	-	良
宝安区中医院 (集团)	饶克瑯	87.65	良	-	良
暨南大学	孙升云	87.3	良	-	良
惠州市中心人民医院	钟启腾	87.25	良	-	良
汕头市中医院	郑瑞璋	85.9	良	-	良
	杨燕贤	84.1	良	-	良
肇庆市中医院	吴社泉	85.45	良	良	良
中山市中医院	李燕林	85.25	良	-	良
	赖海标	84.25	良	-	良



	佛山市中医院	曾莺	84.25	良	-	良
	广东医科大学	刘强	83.95	良	-	良
	信宜市中医院	陈永炎	82.95	良	-	良
	广东省第二中医院	高敏	82.95	良	-	良
		陈宁	81.7	良	-	良
		刘文刚	72.7	中	-	中
	广东药科大学	洪敏	81	良	-	良
		刘强	83.95	良	-	良
	惠州市中医院	王丽	79.95	中	-	中
	高州市中医院	李鳌才	79.25	中	-	中
	清远市中医院	胡金明	77.95	中	-	中
	广东省妇幼保健院	刘颖	-	-	中	中
	南山区人民医院	黄胜光	72.5	中	合格	合格
	兴宁市中医院	杨郎	65.45	合格	合格	合格
	清远市妇幼保健院	曾宪进	63.5	合格	合格	合格
	中山大学附属第一医院	陈泽雄	-	-	差	差
	中山大学附属第一医院	张诗军	-	-	差	差
合计			85.61	良	良	良

18) 省名中医传承工作室建设项目

表 5-18 项目综合评价情况

项目总数 (个)	项目承担单位	工作室	初评综合得分	初评等级	现场评价等级	终评结果
80	清远市中医院	黄宗良	96	优	优	优
		胡金明	81	良	-	良
	湛江市第二中医医	肖波	94.05	优	-	优

院						
广州中医药大学第一附属医院	李赛美	93.6	优	-	优	
	冼绍祥	90.45	优	-	优	
	何伟	89.7	良	-	良	
	赵立诚	88.75	良	-	良	
	林丽珠	87.5	良	-	良	
	刘小虹	85.25	良	-	良	
	庄礼兴	85.15	良	-	良	
广州市荔湾区中医院	沈坚华	93.4	优	-	优	
广东药科大学附属第一医院	郭姣	89.9	良	-	良	
广州市中医医院	黄德弘	89.75	良	-	良	
	祝维峰	76.55	中	-	中	
	徐雯	74.5	中	-	中	
汕头市中医医院	陈超	89.2	良	-	良	
	林创坚	80.6	良	-	良	
广州医科大学附属第一医院	邱志楠	88.75	良	-	良	
肇庆市中医院	吴社泉	87.55	良	-	良	
	谢少龙	86.15	良	-	良	
广东省中医院	黄燕	87.05	良	-	良	
	刘金文	87.05	良	-	良	
	黄培新	86.85	良	-	良	
	陈志强	86.75	良	-	良	
	李云英	82.7	良	-	良	
	池晓玲	81.45	良	-	良	
	陈达灿	79.25	中	-	中	
梅州市第二中医医	温乃元	86.5	良	-	良	

院	曾胜	85.25	良	-	良
深圳市中医院	魏周科	86.25	良	-	良
	杨卓欣	82.1	良	-	良
	周大桥	81.9	良	-	良
	彭力平	64.2	合格	合格	合格
阳江市中医医院	冯小燕	85.95	良	-	良
	李爱民	82.65	良	-	良
广东省人民医院	王昌俊	85.9	良	-	良
南方医科大学中西医结合医院	谢炜	85.4	良	-	良
	文小敏	84.85	良	-	良
	魏连波	81.85	良	-	良
	周迎春	81.2	良	-	良
广州中医药大学顺德医院（顺德区中医院）	黄枫	85.15	良	-	良
珠海市中西医结合医院	刘志龙	84.2	良	-	良
中山大学附属第三医院	杨宏志	83.5	良	-	良
罗定市中医院	梁其源	83.1	良	-	良
广州中医药大学第三附属医院	黄宏兴	82.7	良	-	良
	方坚	79.75	中	-	中
	于天启	75.5	中	-	中
广东省中西医结合医院	李俊雄	82.35	良	-	良
	廖志山	81.6	良	-	良
广州市正骨医院	黄崇博	82.25	良	-	良
中山市中医院	李旭	82.25	良	-	良
	陈金泉	76	中	中	中
广东省第二中医院	范德辉	82.15	良	-	良

		戈焰	79.65	中	-	中
		汪何	69.9	合格	中	中
		许学猛	66.25	合格	良	良
		谢波	65.2	合格	中	中
	东莞市中医院	蔡立民	82.1	良	-	良
		叶小汉	76.85	中	-	中
	暨南大学附属第一医院	陈利国	81.75	良	-	良
	深圳市宝安中医院 (集团)	金远林	81.65	良	-	良
		尹建平	78.6	中	-	中
	揭阳市中医院	卢永兵	81	良	良	良
	广州市中西医结合医院	陈朝俊	80.95	良	-	良
	广东省妇幼保健院	陈凤媚	80.15	良	-	良
	佛山市中医院	蒋开平	79.5	中	-	中
	江门市五邑中医院	余尚贞	76.9	中	-	中
		杜发斌	75.2	中	-	中
	湛江市第一中医医院	蔡柏	76.5	中	-	中
	河源市中医院	钟强	74.45	中	中	中
	惠州市中医院	陈洪	68.6	合格	合格	合格
	韶关市中医院	黄献民	68.35	合格	中	中
	佛山市顺德区第一人民医院	龙倩玲	66.25	合格	合格	合格
	韶关市粤北人民医院	饶振芳	65.7	合格	良	良
	广东省第二人民医院	梁兆球	64.9	合格	合格	合格
	茂名市中医院	黎治荣	64.1	合格	差	差

	茂名市中医院	张帆	-	-	-	差
	潮州市中医医院	林汉森	56	差	差	差
	广东医科大学附属 医院	莫通	-	-	-	中
合计			80.96	良	良	良

20) 中医药创新研究中心建设项目

表 5-20 项目综合评价情况

项目总数 (个)	项目承担单位	负责人	初评综合得分	初评等级	现场评价等级	终评结果
5	广东药科大学	郭姣	90.5	优	中	中
		王秋红	87.1	良	-	良
		杨全	83.7	良	-	良
	广东省中医院		90	优	-	优
	南方医科大学		89.6	良	-	良
	广州中医药大学第一附属医院		89.5	良	-	良
	广东省第二中医院		86.6	良	-	良
合计			88.1	良	良	良

24) 对外交流与合作项目

表 5-24 项目综合评价情况

项目总数 (个)	项目承担单位	初评综合得分	初评等级	现场评价等级	终评结果
5	广州市卫生计生委(广州白云山和记黄埔中药有限公司神农草堂中医药博物馆)	100.00	优	优	优
	汕头市卫生计生局(广东太安堂药业股份有限公司)	93.50	优	-	优
	江门市卫生计生局(江门市新	91.50	优	-	优

	会陈皮村市场股份有限公司)				
	惠州市卫生健康局	90.00	优	-	优
	广东省中医药局 (人之初杂志社)	-	-	合格	合格
	合计	93.75	优	优	优

25) 省级中医药宣传平台项目

表 5-25 项目综合评价情况

项目总数 (个)	项目承担单位	初评综合得分	初评等级	现场评价等级	终评结果
2	广州中医药大学第一附属医院	-	-	中	中
	广东省中医药局	-	优	-	优
	合计	良	良		良

26) 中医药科普宣传项目

表 5-26 项目综合评价情况

项目总数 (个)	项目承担单位	初评综合得分	初评等级	现场评价等级	终评结果
1	广东省中医药局	-	优	优	优
	合计	优	优	-	优

27) 中医药文化宣传教育基地建设项目

表 5-27 项目综合评价情况

项目总数 (个)	项目承担单位	初评综合得分	初评等级	现场评价等级	终评结果
13	广州白云山中一药业有限公司	100	优	优	优
	湛江市卫生健康局	99	优	优	优
	惠州市卫生健康局	97	优	优	优
	广东太安堂药业股份有限公司	96.5	优	优	优

	南寿峰健康产业园	96.5	优	优	优
	阳春市中医院	95	优	优	优
	无限极(中国)有限公司新会生产基地	94	优	-	优
	禅城区博物馆	88.5	良	-	良
	龙岗区中医院	83	良	-	良
	化州市中医院	82	良	-	良
	珠海经济特区天然药物研究所有限公司	82	良	-	良
	肇庆市中医院	80.4	良	-	良
	清远市卫生健康局	78.5	中	-	中
	合计	90.18	优	-	优

28) 考核、评审、检查、信息化及依法行政等管理工作(共包括5个项目)

28-1) 科教评审、检查业务项目

表 5-28-1 项目综合评价情况

项目总数 (个)	项目承担单位	初评综合得分	初评等级	现场评价等级	终评结果
7	佛山市中医院	98.8	优	优	优
	广东省中医院	97	优	优	优
	广州中医药大学继续教育学院	94.8	优	-	优
	广州中医药大学第一附属医院	93	优	-	优
	广东省第二中医院	91.95	优	-	优
	中山市中医院	90	优	-	优
	广东省第二中医院	89.53	良	-	良
	合计	93.58	优	优	优

28-2) 中医药统计与信息化项目

表 5-28-2 项目综合评价情况

项目总数 (个)	项目承担单位	初评综合得分	初评等级	现场评价等级	终评结果
1	广东省卫生健康委服务中心	-	-	-	-
合计		-	-	-	-

28-3) 传统医学师承和确有专长人员医医师资格考核项目

表 5-28-3 项目综合评价情况

项目总数 (个)	项目承担单位	初评综合得分	初评等级	现场评价等级	终评结果
1	广州中医药大学继续教育学院	92.15	优	-	优
合计		92.15	优	-	优

28-4) 广东省中医医术确有专长医师资格考核项目

表 5-28-4 项目综合评价情况

项目总数 (个)	项目承担单位	初评综合得分	初评等级	现场评价等级	终评结果
1	广州中医药大学继续教育学院	92.95	优	-	优
合计		92.95	优	-	优

28-5) 依法行政等管理工作项目

表 5-28-5 项目综合评价情况

项目总数 (个)	项目承担单位	初评综合得分	初评等级	现场评价等级	终评结果
1	广东省中医药局	100	优	-	优
合计		-	优	-	优

29) 动态保护项目

表 5-29 项目综合评价情况

项目总数	项目承担单位	初评综合得分	初评等级	现场评价等级	终评结果
------	--------	--------	------	--------	------



(个)		合得分	等级	价等级	结果
1	广州中医药大学	92.6	优	-	优
	合计	92.6	优	-	优

### 30) 人才培养项目

表 5-30 项目综合评价情况

项目总数 (个)	项目承担单位	初评综合得分	初评等级	现场评价等级	终评结果
1	广州中医药大学	79	中	-	中
	合计	79	中	-	中

### 31) 生产基地评估项目

表 5-31 项目综合评价情况

项目总数 (个)	项目承担单位	初评综合得分	初评等级	现场评价等级	终评结果
1	广东省中医药科技发展交流中心	73.5	中	合格	合格
	合计	73.5	中	合格	合格

### 32) 文化保护项目

表 5-32 项目综合评价情况

项目总数 (个)	项目承担单位	初评综合得分	初评等级	现场评价等级	终评结果
1	广东省中医药博物馆	85.2	良	-	良
	合计	85.2	良	-	良

### 33) 资源动态监测项目

表 5-33 项目综合评价情况

项目总数 (个)	项目承担单位	初评综合得分	初评等级	现场评价等级	终评结果
-------------	--------	--------	------	--------	------

1	广州中医药大学	71	中	中	中
合计		71	中	中	中

## 二 绩效表现

### (一) 资金到位情况简述

根据广东省财政厅《关于提前下达 2018 年医疗卫生健康事业发展专项资金专项资金（传承发展中医药事业）的通知》（粤财社〔2017〕326 号）、广东省财政厅《关于批复 2018 年省级部门预算的通知》（粤财预〔2018〕26 号）和广东省财政厅《关于安排 2018 年医疗卫生健康事业发展专项资金专项资金（传承发展中医药事业）省级部分资金的通知》（粤财社〔2018〕45 号），2018 年医疗卫生健康事业发展专项资金(传承发展中医药事业)总共安排资金 20066 万元，用于 33 类 707 个专项项目的建设，以支持全省中医药的事业发展。

#### 1 按项目资金到位情况

资金共涉及 194 个项目承担单位，全部专项经费均由省中医药局按计划下达，由省财厅按时分批按计划拨付相关省直单位及各地市归口管理部门，统计截止至 2018 年 8 月 15 日，省下达项目资金到位率为 100%。

表 6-1 所有项目资金到位率统计情况

序号	项目类别	预算金额(万元)	到位金额(万元)	到位率(%)
1	省级中医医院设备及修缮项目	6631	6631	100
2	省市级中医院建设	3000	3000	100
3	2018 年县区级中医医院 信息化规划能力及应用水平建设项目	200	200	100
	广东省中医药建设项目专项资金监控与绩效评价系统	60	60	100
	2018 年全省中医医院“互联网+医疗健康”专题培训班	17	17	100
4	中医院治未病中心(平台)建设(省级“治未病”指导中心)	500	500	100

	中医院治未病中心(平台)建设(治未病平台)	2600	2600	<b>100</b>
5	全省中医药适宜技术网络视频平台建设(省级基地)	150	150	100
	全省中医药适宜技术网络视频平台建设(县级平台)	920	920	<b>100</b>
6	全省中医类别医师资格实践技能考试片区基地建设	400	400	100
7	综合医院中医药工作示范单位	250	250	<b>100</b>
8	中药特色技术传承人才培养	60	60	100
9	县区级中医临床技术骨干培训	60	60	100
10	国医大师学术思想传承	75	75	100
11	全国名中医传承工作室建设	200	200	100
12	传染病中医药防治研究	40	40	100
13	第六批全国老中医药专家师承项目继承人经典理论培训	17	17	100
14	全国基层名老中医药专家传承工作室继承人集中理论培训项目	18	18	100
15	中医药管理机构人才及中医院管理人才培养	30	30	<b>100</b>
16	中医住院医师(全科医生)规范化培训师资培养	60	60	100
17	第三批省名中医师承培训项目	30	30	100
	第三批省名中医师承	300	300	<b>100</b>
18	省名中医传承工作室建设	800	800	<b>100</b>
19	省名中医工作津贴	80	80	100

20	中医药创新研究中心建设	800	800	100
21	面上科研项目	300	300	<b>100</b>
22	重点科研项目	210	210	<b>100</b>
23	单方验方科研项目	250	250	<b>100</b>
24	对外交流与合作	60	60	100
	对外交流与合作项目（粤港澳大湾区中医药传承创新交流研讨）项目	20	20	100
25	省级中医药宣传平台	20	20	<b>100</b>
	省级中医药宣传平台	150	150	100
26	中医药科普宣传项目	250	250	100
27	中医药文化宣传教育基地建设	160	160	100
28-1	科教评审、检查业务	70	70	100
28-2	中医药统计与信息化	40	40	<b>100</b>
28-3	传统医学师承和确有专长人员医师资格考核	30	30	100
28-4	全省中医医术确有专长医师资格考核考试项目	160	160	100
28-5	依法行政等管理工作项目	548	548	100
29	动态保护	50	50	100
30	人才培养	50	50	100
31	生产基地评估	80	80	100
32	文化保护	200	200	100
33	资源动态监测	120	120	100
合计:		20066	20066	100

## （二）资金使用绩效情况评价

### 1 资金使用的经济性评价

2018年医疗卫生健康事业发展专项资金（传承发展中医药事业）总共安排资金20066万元，统计截止至2019年8月15日，已经执行14674.81万元，总执行率73.13%。（见表7-1）。

其中，2018年资金使用周期为一年的项目资金执行10414.71万元，执行率83.08%（见表7-3），2018年开始资金使用周期为两年的项目资金执行2202.8万元，执行率49.61%（见表7-4），2018年开始资金使用周期为三年的项目资金执行2057.31万元，执行率66.58%（见表7-5）。所有项目承担单位的预算执行、资金支出和会计核算规范，均没有超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的情况，自查无违规金额；各级业务主管部门进行过检查监控，能够做到专账核算，核算凭证规范有效。

表7-1 所有项目资金支出率统计情况

序号	项目类别	预算金额 (万元)	支出金额 (万元)	支出率(%)
1	省级中医医院设备及修缮项目	6631	6631	100
2	省市级中医院建设	3000	2000	66.67
3	中医药信息化规划能力及应用水平建设	277	226.55	81.79
4	中医院治未病中心（平台）建设	3100	1858.854	59.96
5	全省中医药适宜技术网络视频平台建设	1070	642.4285	60.04
6	全省中医类别医师资格实践技能考试片区基地建设	400	314.44	78.61
7	综合医院中医药工作示范单位	250	116.47	46.59
8	中药特色技术传承人才培养	60	48.59	80.98
9	县区级中医临床技术骨干培训	60	59.76	99.60

10	国医大师学术思想传承	75	50.83	67.77
11	全国名中医传承工作室建设	200	145.49	72.75
12	传染病中医药防治研究	40	37.10	92.75
13	第六批全国老中医药专家师承项目继承人经典理论培训	17	17	100.00
14	全国基层名老中医药专家传承工作室继承人集中理论培训项目	18	18	100.00
15	中医药管理机构人才及中医院管理人才培训	30	30	100.00
16	中医住院医师（全科医生）规范化培训师资培养	60	60	100.00
17	第三批省名中医师承	330	45.0035	13.64
18	省名中医传承工作室建设	800	438.71	54.84
19	省名中医工作津贴	80	80	100.00
20	中医药创新研究中心建设	800	586.16	73.27
21	面上科研项目	300	65.82	21.94
22	重点科研项目	210	49.75	23.69
23	单方验方科研项目	250	40.98	16.39
24	对外交流与合作	60	54.20	90.33
	对外交流与合作项目（粤港澳大湾区中医药传承创新交流研讨）项目	20	20	100.00
25	省级中医药宣传平台	20	1	5.0
	省级中医药宣传平台（局）	150	150	100.00

26	中医药科普宣传项目	250	243.00	97.20
27	中医药文化宣传教育基地建设	160	104.23	65.14
28-1	科教评审、检查业务	70	51.14	73.06
28-2	中医药统计与信息化	40	40	100.00
28-3	传统医学师承和确有专长人员医师资格考核	30	10.93	36.43
28-4	全省中医医术确有专长医师资格考核考试项目	160	1.63	1.02
28-5	依法行政等管理工作项目	548	412.00	75.18
29	动态保护	50	35.23	70.46
30	人才培养	50	6.2005	12.40
31	生产基地评估	80	中医药交流中心撤编，资金冻结，工作继续开展	0.00
32	文化保护	200	10.78	5.39
33	资源动态监测	120	42.52	35.43
合计:		20066	14704.81	73.13

### (1) 按地市、省属资金实际使用情况

①在 21 个地市中，共有 4 个地市实际支出率 > 75%，占比 19.05% (4/21)，有 5 个地市实际支出率低于 25%，占比 23.8% (5/21)，具体情况详见表 7-2。

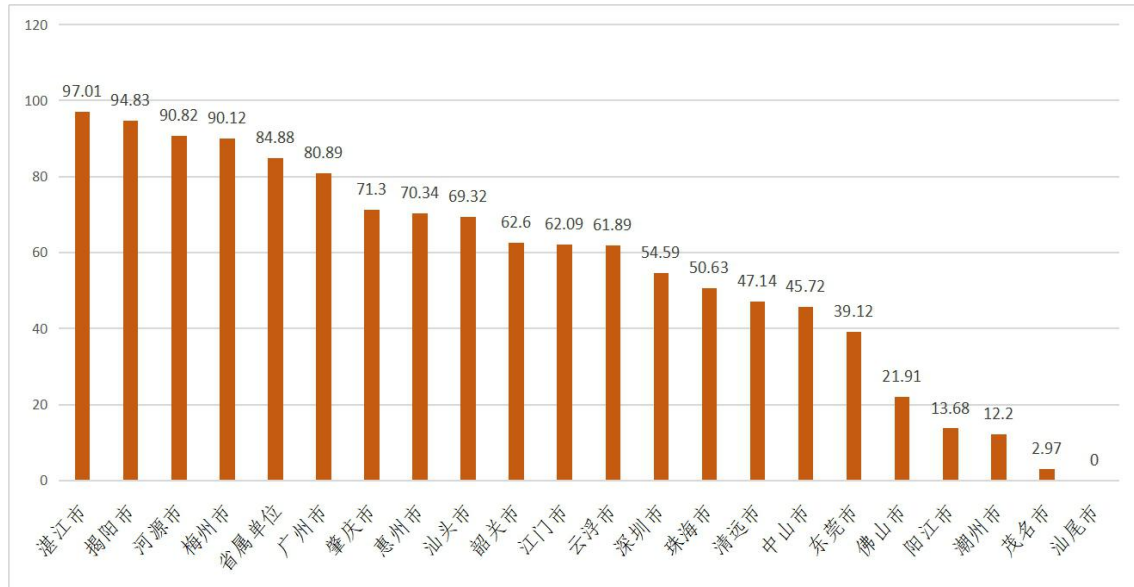


图 2 地市资金实际支出率柱状图

表 7-2 资金实际支出率低于 25%的地市情况明细表

地市	排名	项目类别	到位金额 (万元)	使用金额 (万元)	支出率 (%)
佛山	1	科教评审、检查业务	2	2	100
	2	中医药文化宣传教育基地建设	10	10	100
	3	县区级中医临床技术骨干培训	10	10	100
	4	中药特色技术传承人才培养	12	7.22	60.17
	5	省名中医传承工作室建设	50	17.51	35.01
	6	全省中医类别医师资格实践技能考试片区基地建设	100	21.16	21.16
	7	面上科研项目	17	3	17.65
	8	单方验方科研项目	40	6.73	16.82
	9	第三批省名中医师承	18	1.05	5.81
	10	中医院治未病中心(平台)建设 (治未病平台)	100	0	0
		合计	359	78.66	21.91
阳江	1	中医药文化宣传教育基地建设	10	10	100
	2	省名中医传承工作室建设	20	6.69	33.44



	3	中医院治未病中心（平台）建设 （治未病平台）	100	20	20
	4	单方验方科研项目	10	0.52	5.22
	5	综合医院中医药工作示范单位	50	0	0
	6	全省中医药适宜技术网络视频 平台建设（县级平台）	80	0	0
	7	面上科研项目	2	0	0
	合计			272	37.21
潮州	1	中医院治未病中心（平台）建设 （治未病平台）	100	98	98
	2	全省中医药适宜技术网络视频 平台建设（县级平台）	40	37.53	93.83
	3	第三批省名中医师承	6	5.48	91.29
	4	省市级中医院建设	1000	0	0
	5	省名中医传承工作室建设	10	0	0
	合计			1156	141.01
茂名	1	面上科研项目	1	1	100
	2	第三批省名中医师承	6	0.1	1.64
	3	中医药文化宣传教育基地建设	20	0	0
	4	省名中医传承工作室建设	10	0	0
	合计			37	1.1
汕尾	1	中医院治未病中心（平台）建设 （治未病平台）	100	0	0
	2	省名中医传承工作室建设	0	0	0
	3	全省中医药适宜技术网络视频 平台建设（县级平台）	0	0	0
	合计			100	0

②在 33 个省属资金到达单位中，共有 8 个单位资金实际支出率 > 75%，占比 24.24% (8/33)，有 14 个单位实际支出率低于 25%，占比 42.42% (14/33)，其中 7 个单位实际支出率为 0，占比 21.21% (7/33)，具体情况详见图 3。

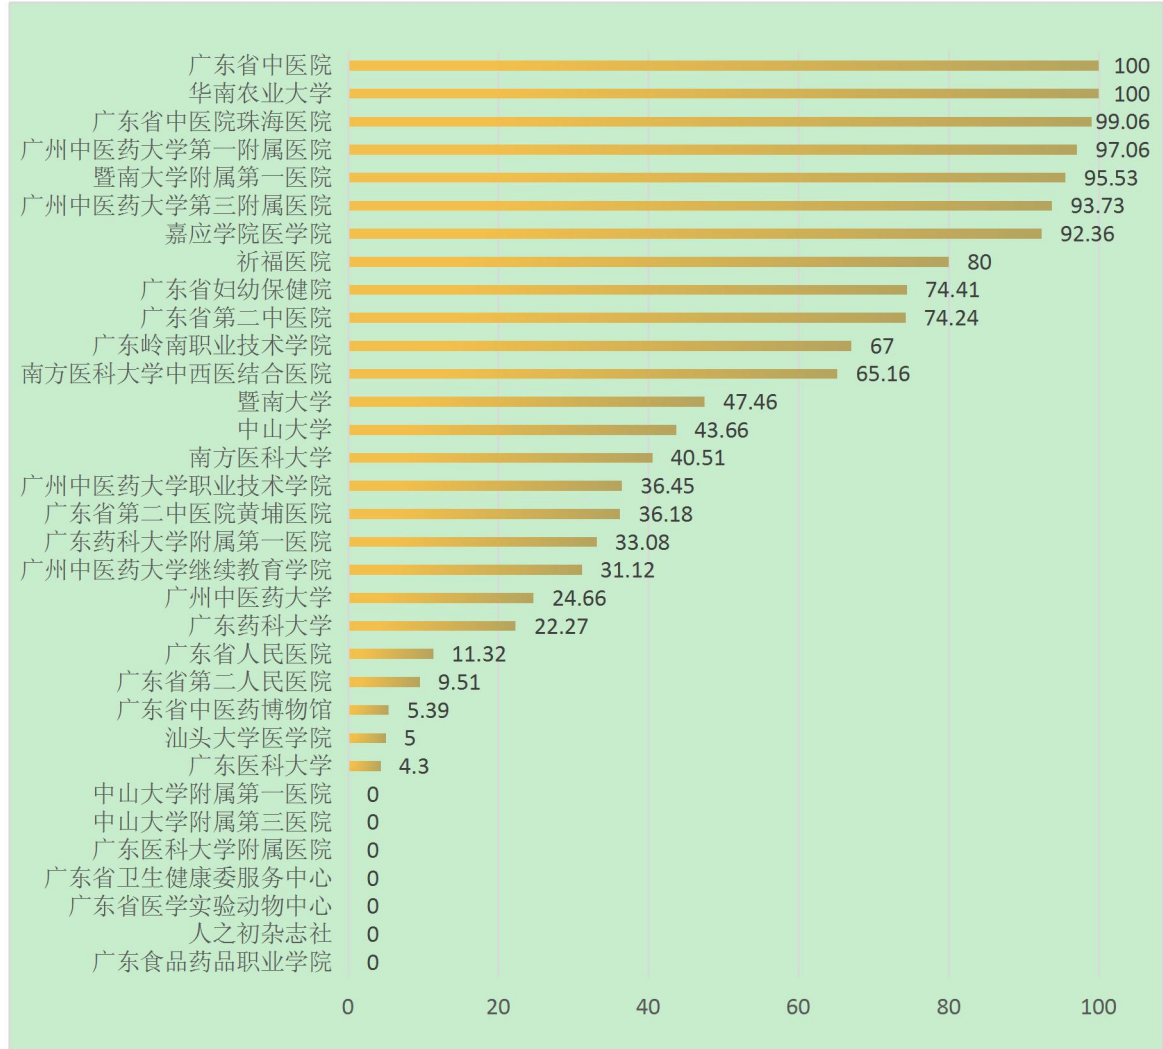


图 3 省级单位项目资金实际支出率条状图

## (2) 项目资金使用年限的资金实际支出率情况

### ①资金使用年限为一年期的资金到位及使用情况

2018 年省医疗卫生健康事业发展专项资金（传承发展中医药事业）项目共有 26 类 37 小类一年期项目，项目资金总体到位率为 **96.99%**，其中资金到位率为 100% 的项目有 31 项 (**83.78%**)；项目总体资金实际支出率为 **83.08%**，其中资金实际支出率为 100% 的项目有 9 项 (**27.3%**)，100 > 实际支出率 ≥ 75% 的项目有 6 项 (**18.2%**)，75% > 实际支出率 ≥ 50% 的项目有 8 项 (**24.24%**)，50% > 实际

支出率 $\geq$ 25%的项目有3项(9%)，实际支出率 $<$ 25%的项目有4项(12.12%)，有3个项目实际支出率为0(9%)。具体情况详见表7-3。

表7-3 资金使用年限一年期项目资金支出率统计情况

序号	项目名称	项目实施周期	预算金额(万元)	到位金额(万元)	支出金额(万元)	到位率(%)	支出率(%)
1	省级中医医院设备及修缮项目	2018-2018	6631	6631	6631	100	100
3	2018年县区级中医医院信息化规划能力及应用水平建设项目	2018-2018	200	200	200	100	100
	广东省中医药建设项目专项资金监控与绩效评价系统	2018-2018	60	60	9.55	100	15.92
	2018年全省中医医院“互联网+医疗健康”专题培训班	2018-2018	17	17	17	100	100
	当前项目合计		277	277	226.55	100	81.79
5	全省中医药适宜技术网络视频平台建设(县级平台)	2018-2018	920	720	539.1194	78.26	74.88
	全省中医药适宜技术网络视频平台建设(省级基地)	2018-2018	150	150	103.3091	100	68.87
	当前项目合计		1070	870	642.4285	81.31	73.84
6	全省中医类别医师资格实践技能考试片区基地建设	2018-2018	400	400	314.4357	100	78.61
7	综合医院中医药工作示范单位	2018-2018	250	200	116.47	80	58.24
8	中药特色技术传承人才培训	2018-2020	60	60	48.5935	100	80.99
9	县区级中医临床技术骨干培训	2018-2018	60	60	59.7599	100	99.6

10	国医大师学术思想传承	2018-2018	75	75	50.8349	100	67.78
12	传染病中医药防治研究	2018-2018	40	40	37.1	100	92.75
13	第六批全国老中医药专家师承项目继承人经典理论培训	2018-2018	17	17	17	100	100
14	全国基层名老中医药专家传承工作室继承人集中理论培训项目	2018-2018	18	18	18	100	100
15	中医药管理机构人才及中医院管理人才培训	2018-2018	30	30	30	100	100
16	中医住院医师（全科医生）规范化培训师资培养	2018-2018	60	60	60	100	100
18	省名中医传承工作室建设	2018-2020	800	770	438.7081	96.25	56.98
19	省名中医工作津贴	2018-2018	80	80	80	100	100
20	中医药创新研究中心建设	2018-2019	800	800	586.1648	100	73.27
24	对外交流与合作项目（粤港澳大湾区中医药传承创新交流研讨）项目	2018-2018	20	20	20	100	100
25	省级中医药宣传平台	2018-2018	20	20	1	100	5.0
	省级中医药宣传平台	2018-2018	150	150	150	100	100
26	中医药科普宣传	2018-2018	250	250	243	100	97.2
27	中医药文化宣传教育基地建设	2018-2018	160	160	104.2325	100	65.15
28-1	科教评审、检查业务	2018-2018	70	70	51.1406	100	73.06
28-2	中医药统计与信息化	2018-2018	40	40	40	100	100

28-3	传统医学师承和确有专长人员医师资格考核	2018-2018	30	30	10.9345	100	36.45
28-4	全省中医医术确有专长医师资格考核考试项目	2018-2018	160	160	1.6343	100	1.02
28-5	依法行政等其他行政工作	2018-2018	548	548	412	100	75.18
29	动态保护	2018-2018	50	50	35.2286	100	70.46
30	人才培养	2018-2018	50	50	6.2005	100	12.4
31	生产基地评估	2018-2018	80	80	资金冻结	100	0
32	文化保护	2018-2018	200	200	10.7805	100	5.39
33	资源动态监测	2018-2018	120	120	42.5168	100	35.43
合计			13963	13543	10414.71	96.99	76.90

在资金使用年限为一年期的项目中,共有1个地市和4家省属单位资金实际支出率为100%。具体地市和省属单位支出情况详见图3-4,省属单位支出明细详见附录5。

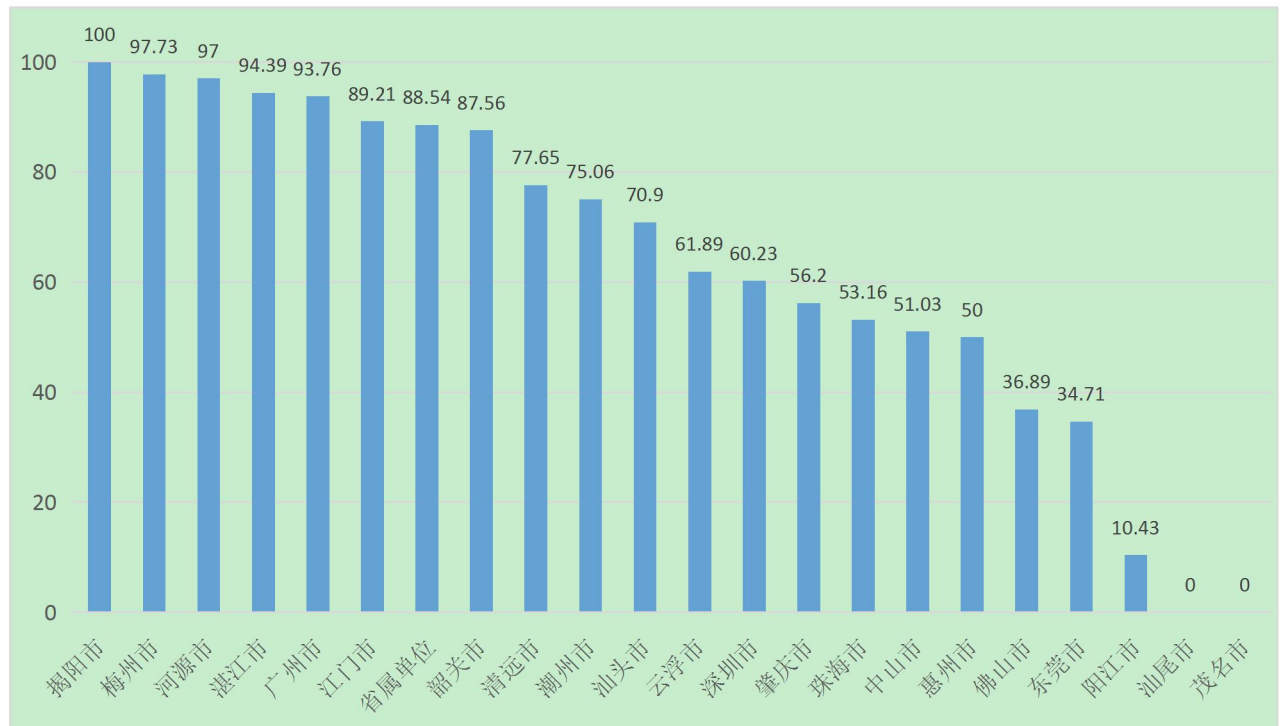


图3 各地市使用年限一年期项目资金实际支出率柱状图

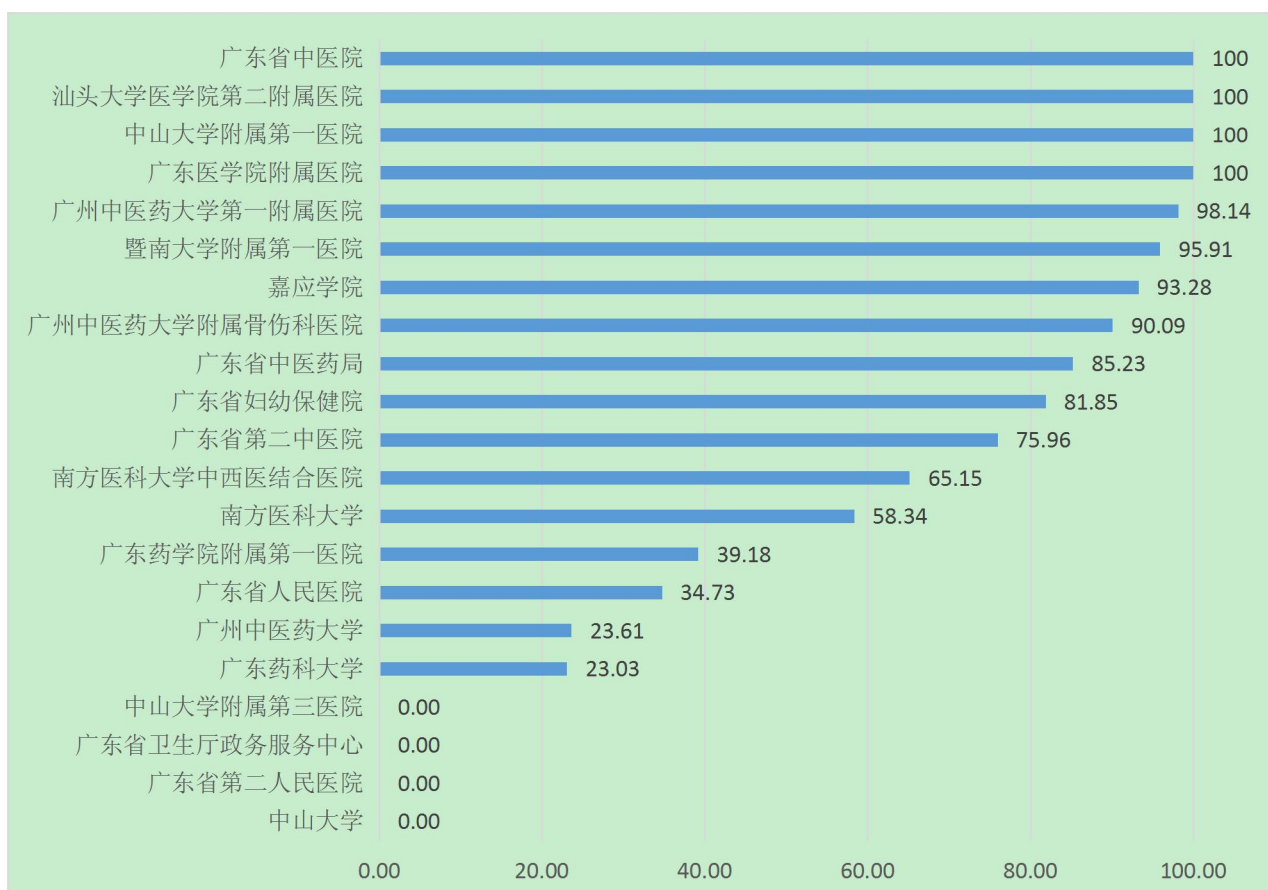


图 4 省属单位使用年限一年期项目资金实际支出率条状图

## ②资金使用年限为二年期的资金到位及使用情况

2018 年省医疗卫生健康事业发展专项资金（传承发展中医药事业）项目共有 6 类 7 小类二年期项目，项目资金总体到位率为 **96.07%**，其中资金到位率为 100% 的项目有 2 项（**28.57%**）；由于此类项目的资金使用年限为两年，故本次绩效考核按一年资金实际支出率达 50% 即为合格，项目总体资金实际支出率为 **49.61%**，其中项目资金实际支出率  $\geq 50\%$  的项目有 3 项（**37.5%**）， $50\% >$  实际支出率  $\geq 25\%$  的项目有 0 项（**0%**）， $25\% >$  实际支出率  $\geq 0\%$  的项目有 4 项（**50%**），有 1 个项目实际支出率为 0（**12.5%**）。具体情况详见表 7-4。

表 7-4 资金使用年限二年期项目资金支出率统计情况

序号	项目名称	项目实施周期	预算金额 (万元)	支出金额 (万元)	到位率 (%)	支出率 (%)
4	中医院治未病中心（平台）建设（县级治未病平台）	2018-2019	2600	1456.2662	96.15	58.25

	中医院治未病中心（平台） 建设（省级“治未病”指导 中心）	2018-2019	500	402.5938	100	80.52
	当前项目合计		3100	1858.854	96.77	59.96
11	全国名中医传承工作室建设	2018-2020	200	145.4908	100	72.75
17	第三批省名中医师承	2018-2020	300	41.8964	92	15.18
21	面上科研项目	2018-2019	300	65.816	93.78	23.55
22	重点科研项目	2018-2019	210	49.7516	94.29	25.13
23	单方验方科研项目	2018-2019	250	40.9841	94	17.44
合计:			4360	2202.79	96.07	52.59

在资金使用年限为二年期的项目中，共有 2 家省属单位资金实际支出率为 100%。具体地市和省属单位支出情况详见图 5-6，省属单位支出明细详见附录 5。

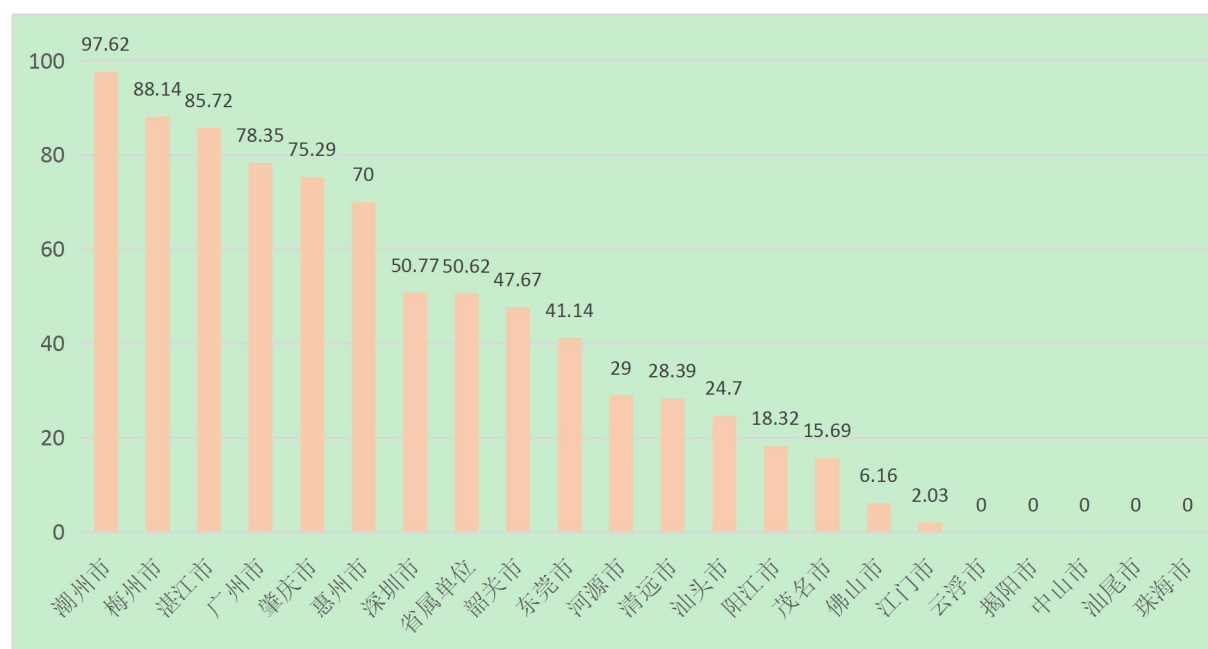


图 5 各地市使用年限二年期项目资金实际支出率柱状图

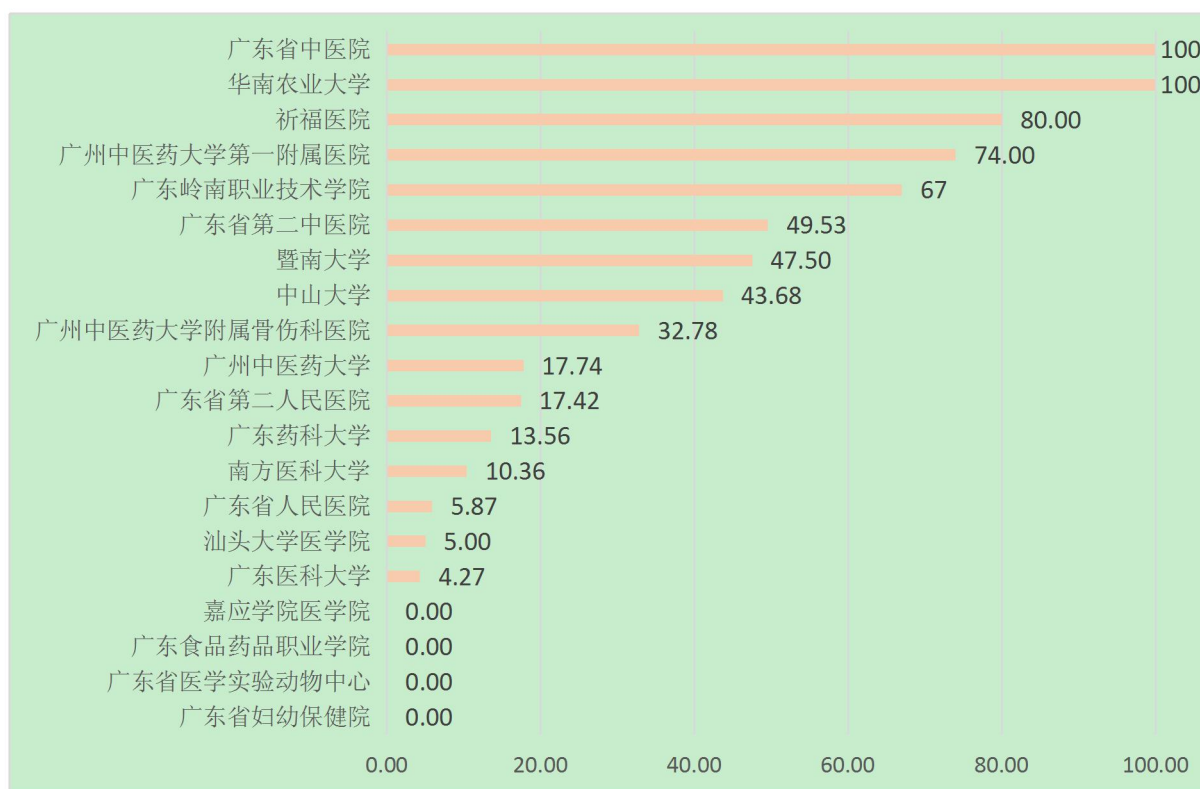


图 6 省属单位使用年限二年期项目资金实际支出率条状图

### ③资金使用年限为三年期的资金到位及使用情况

2018 年省医疗卫生健康事业发展专项资金（传承发展中医药事业）项目共有 3 类 3 小类三年期项目，项目资金总体到位率为 100%；由于此类项目的资金使用年限为三年，故本次绩效考核若项目承担单位无资金使用计划则按一年资金实际支出率达 33.33%即为合格，项目总体资金实际支出率为 66.58%，其中资金实际支出率 ≥ 33.33%的项目有 2 项（66.67%），实际支出率 < 20%的项目有 1 项（33.33%），无项目实际支出率为 0。具体情况详见表 7-5。

表 7-5 资金使用年限三年期项目资金支出率统计情况

序号	项目名称	项目实施周期	预算金额(万元)	到位金额(万元)	支出金额(万元)	到位率(%)	支出率(%)
2	省市级中医院建设	2018-2020	3000	3000	2000	100	66.67
17	第三批省名中医师承培训项目	2018-2020	30	30	3.1071	100	10.36
24	对外交流与合作	2018-2020	60	60	54.2	100	90.33



合计	3090	3090	2057.31	100	66.58
----	------	------	---------	-----	-------

在资金使用年限为三年期的项目中，共有 4 个地市和 1 家省属单位资金实际支出率为 100%，具体地市和省属单位支出情况详见图 7-8，省属单位支出明细详见附录 5。

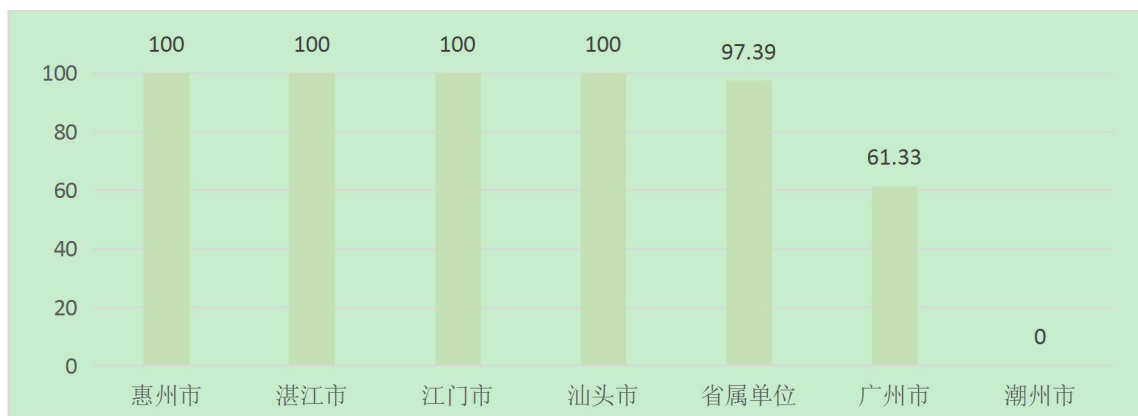


图 7 各地市使用年限三年期项目资金实际支出率柱状图

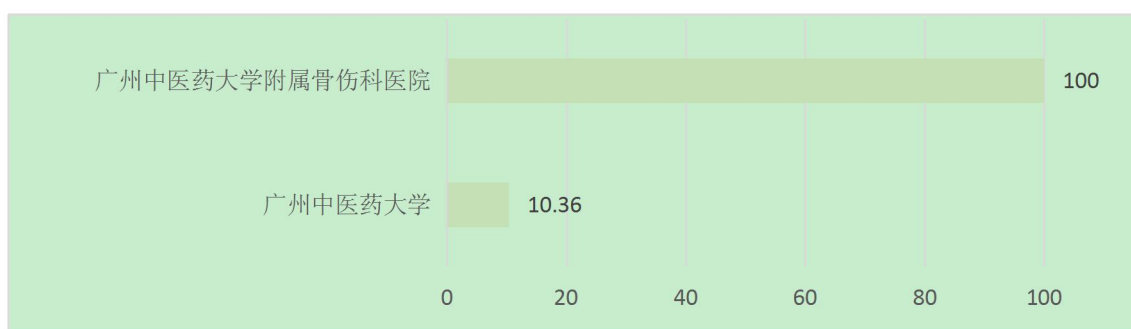


图 8 省属单位使用年限三年期项目资金实际支出率条状图

## 2 资金使用的产出和效益评价

绩效评价小组遵守《关于提前下达 2018 年医疗卫生健康事业发展专项资金（传承发展中医药事业）的通知》（粤财社〔2017〕326 号）的文件精神，严格按照省中医药局印发的《中医药部门专项资金项目工作任务方案》及相关实施的要求，针对 33 类 44 项中医药建设专项项目自身的特点，设计了产出和效益指标，用于评价项目资金使用的效率性、效果性和公平性。

### （1）项目资金使用的效率性评价

效率性绩效指标，主要包括数量指标、时效指标、质量指标几个方面。

表 8 项目效率性评价情况汇总表

序号	项目类别	指标内容及口径	效率性评价情况
----	------	---------	---------

序号	项目类别	指标内容及口径	效率性评价情况
1	省级中医医院设备及修缮项目	医疗设备采购 (医疗设备采购和修缮项目)	完成指标任务, 占比 100%
2	省市级中医院建设	按照既定时间开展项目建设	完成指标任务, 占比 100%
3	中医药信息化规划能力及应用水平建设	根据实施方案, 设计完整的培训方案(满足实施方案中内容、师资和学员要求), 并完成所承办的集中培训, 培训人数达标率 $\geq 95\%$ , 有保证培训纪律的措施和汇编培训课件	完成指标任务, 占比 100%
		系统建成使用, 其功能满足需求	完成指标任务, 占比 100%
		信息机房建设符合《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)C级要求, 核心系统至少达到信息系统安全等级保护二级相关要求, 实现互联网+诊疗服务功能、上级医院和下级社区的远程诊疗	完成指标任务, 占比 100%
4	中医院治未病中心(平台)建设	按照既定时间开展项目建设	27个项目完成指标任务, 占比 87.1%
		5家省级中医“治未病”指导中心参与研究编写全省中医“治未病”指导手册、培训教材	5个项目完成指标任务, 占比 100%
		5家省级中医“治未病”指导中心参与中医药预防保健服务人员业务培训和中医“治未病”服务技术培训推广工作	完成指标任务, 占比 100%
		5家省级中医“治未病”指导中心承担行政主管部门交办的基层指	完成指标任务, 占比 100%

序号	项目类别	指标内容及口径	效率性评价情况
		导、考核及“治未病”区域发展研究工作等	
5	全省中医药适宜技术网络视频平台建设	省级平台应完成 7 个地市区域内县（市、区）级中医院骨干医师培训，人数应达 5 人以上	完成指标任务，占比 100%
		省级平台全年应开展适宜技术培训（含国家局培训）20 次	2 个项目完成指标任务，占比 66.67%
		县级平台应选拔 5 人师资参加省级基地中医药适宜技术推广培训	7 个项目完成指标任务，占比 30.43%
		2018 年末，县级平台能够向乡镇卫生院与社区卫生服务中心提供 6 类中医药适宜技术	11 个完成指标任务，占比 47.83%
		推广示教室能满足要求	21 个项目完成指标任务，占比 91.30%
		网络视频平台功能齐全	20 个项目完成指标任务，占比 86.96%
6	全省中医类别医师资格实践技能考试片区基地建设	场地与设施设备齐全，并已建成使用	3 个项目完成指标任务，占比 75%
7	综合医院中医药工作示范单位	按照既定时间开展项目建设	4 个项目完成指标任务，占比 80%（广州市第八人民医院已完成；深圳市妇幼保健院、阳江市人民医院、中山市黄圃人民医院正在建设中）
8	中药特色技术传	每个项目继承人应参加游学轮转 5	19 个项目完成指标任务，占

序号	项目类别	指标内容及口径	效率性评价情况
	承人培训	次及以上	比 95%
9	县区级中医临床技术骨干培训	完成培训人数达标率为 95%-100%	4 个项目完成指标任务，占比 66.67%
		满足实施方案中内容、师资和学员要求，有保证培训纪律的措施和汇编培训课件	完成指标任务，占比 100%
10	国医大师学术思想传承	以国医大师擅长治疗的常见病、疑难病进行系统的总结研究，形成 2 份临床诊疗方案	完成指标任务，占比 100%
		挖掘、整理和研究 2 份国医大师临床资料	2 个项目目完成指标任务，占比 66.67%
		开展 2 次学术交流	完成指标任务，占比 100%
		出版 1 本专著	完成指标任务，占比 100%
		接收 10 名外单位进修人员或研修人员	完成指标任务，占比 100%
		成为培养中医药传承型人才的流动站，建立临床经验共享平台	完成指标任务，占比 100%
11	全国名中医传承工作室建设	建设全国名中医临床（实践）经验示教诊室、示教观摩室、资料室（阅览室）	3 个项目完成指标任务，占比 75%
		收集整理全国名中医医案、验案、笔记、读书临证心得、论著、论文等原始资料完成 ≥ 30 份	完成指标任务，占比 100%
		每月围绕全国名中医学术经验开展 4 次学习交流、讨论或中医医案评价等人才培养相关活动	完成指标任务，占比 100%

序号	项目类别	指标内容及口径	效率性评价情况
12	传染病中医药防治研究	整理和总结了中医药防治传染病的经验、技术和方法	完成指标任务, 占比 100%
		公开发表中医药防治传染病的论文(或专著) 3 篇及以上	完成指标任务, 占比 100%
13	第六批全国老中医药专家师承项目继承人经典理论培训	完成培训人数达标率为 95%-100%	完成指标任务, 占比 100%
		满足实施方案中内容、师资和学员要求, 有保证培训纪律的措施和汇编培训课件	完成指标任务, 占比 100%
14	全国基层名老中医药专家传承工作室继承人集中理论培训项目	完成培训人数达标率为 95%-100%	完成指标任务, 占比 100%
		满足实施方案中内容、师资和学员要求, 有保证培训纪律的措施和汇编培训课件	完成指标任务, 占比 100%
15	中医药管理机构人才及中医院管理人才培养	完成培训人数达标率为 100%	完成指标任务, 占比 100%
16	中医住院医师(全科医生)规范化培训师资培养	完成培训人数达标率为 95%-100%	完成指标任务, 占比 100%
		满足实施方案中内容、师资和学员要求, 有保证培训纪律的措施和汇编培训课件	完成指标任务, 占比 100%
17	第三批省名中医师承	两位继承人均需每年完成半天的跟师学习笔记 60 个。	41 个项目完成指标任务, 占比 82%
		两位继承人均需每年完成 1000 字以上的学习心得或临床经验 12 篇。	40 个项目完成指标任务, 占比 80%
		两位继承人均需每年完成整理指导老师临床医案总结 20 份。	42 个项目完成指标任务, 占比 84%
		指导老师批阅跟师笔记、学习心得、	35 个项目完成指标任务, 占

序号	项目类别	指标内容及口径	效率性评价情况
		临床医案总结，指导性强	比 70%
	第三批省名中医 师承培训项目	完成培训人数达标率为 95%-100%	完成指标任务，占比 100%
		满足实施方案中内容、师资和学员要求，有保证培训纪律的措施和汇编培训课件	完成指标任务，占比 100%
18	省名中医传承工 作室建设	建设全国名中医临床（实践）经验示教诊室、示教观摩室、资料室（阅览室）	42 个项目单位已完成建设，占比 52.5%；35 个项目单位正在建设中，占比 43.75%
		收集整理全国名中医医案、验案、笔记、读书临证心得、论著、论文等原始资料完成 ≥ 30 份	71 个项目完成指标任务，占比 88.75%
		每月围绕全国名中医学术经验开展学习交流、讨论或中医医案评价等人才培养相关活动	62 个项目完成指标任务，占比 77.5%
19	省名中医工作津贴	发放津贴	完成指标任务，占比 100%
20	中医药创新研究中心建设	根据实施方案，在项目周期内完成研究中心建设	完成指标任务，占比 100%
24	对外交流与合作	项目实施的属于合理范围，项目完工率符合进度	完成指标任务，占比 100%
	对外交流与合作项目（粤港澳大湾区中医药传承创新交流研讨）项目	-	未按时提交材料
25	省级中医药宣传平台（院）	-	未按时提交材料

序号	项目类别	指标内容及口径	效率性评价情况
	省级中医药宣传平台(局)	丰富宣传手段,提升广东中医药工作社会影响力	完成指标任务,占比100%
26	中医药科普宣传项目	推动和促进中医药科普宣传	完成指标任务,占比100%
27	中医药文化宣传教育基地建设	具有相应的接待能力,每年接待参观人次	9个项目接待人次≥8000(含)以上;1个项目接待人次≥6000(含)以上;2个项目接待人次≥2000(含)以上;1个项目接待人次<2000
		具有相应的接待能力,每年开放时间200天(含)以上	完成指标任务,占比100%
		开展中医药文化宣传和学术交流活动	12个项目完成指标任务,占比92.31%
		与中小学校或社区、企事业单位签订共建协议	9个项目完成指标任务,占比69.23%
		建有介绍本基地的中医药文化网站、网页或微信公众号	10个项目完成指标任务,占比76.92%
		具备专业的宣教队伍	完成指标任务,占比100%
		具有与本基地相关的文化产品,如研究论著、科普读物等,产品中医药特色突出,内容丰富,及时更新	2个项目完成指标任务,占比15.38%
		具备保护和发展中医药文化宣传教育基地的经费和保障措施	1个项目完成指标任务,占比7.69%
		具备健全规范的中医药文化宣传教育基地管理制度	完成指标任务,占比100%

序号	项目类别	指标内容及口径	效率性评价情况
		设有专门的中医药文化宣传教育基地管理部门	1个项目完成指标任务，占比 7.69%
28-1	科教评审、检查业务	按照实施方案，在项目周期内开展工作，并完成中医药科研项目管理任务或中医药教育项目管理任务	完成指标任务，占比 100%
28-2	中医药统计与信息化	完成相关目标任务	完成指标任务
28-3	传统医学师承和确有专长人员医师资格考核	顺利完成考核工作，按时命题组卷工作和试卷安全保密工作，对于各地市上报的考核人员名单进行严格复核和对于考核过程中发生的违纪违规行为提出处理意见，并上报省中医药局	完成指标任务，占比 100%
28-4	全省中医医术确有专长医师资格考核考试项目	组建管理机构、考核专家库组织专家、考务资格和考核考试的培训 1 次以上，并在考核前 3 个月发布实施细则，做好考试项目及考官保密，建立申诉投诉反馈机制	完成指标任务，占比 100%
28-5	依法行政等管理工作项目	保障局机关日常工作	完成指标任务，占比 100%
29	动态保护	每年提出 3 种符合岭南道地特征、急需保护的中药材品种及其可操作性的保护方案	完成指标任务，占比 100%
30	人才培养	编写 8 本保护品种系列培训教材和培训大纲	完成指标任务，占比 100%
		组织举办 8 期中药材保护培训班	举办 4 场培训班，占比 50%
		每场培训班到场人数达 65 人以上	完成指标任务，占比 100%



序号	项目类别	指标内容及口径	效率性评价情况
31	生产基地评估	开展4场岭南中药材生产基地实地调研基地	完成3场调研，占比75%
		外省中药道地药材生产基地考察交流	未完成
		完成生产基地评估标准的制定	已定制草稿，占比50%
32	文化保护	编撰系列丛书或开发相关文创产品	完成指标任务，占比100%
		举办1次相关精品展览	未完成
		举办1次品种保护交流文化节	未完成
		建设品种保护宣传网络平台	完成指标任务，占比100%
		拍摄岭南中药文化保护相关纪录片	完成指标任务，占比100%
		举办1次文化科普宣教活动	完成指标任务，占比100%
33	资源动态监测	建成中药资源动态监测信息管理系统	正在建设中
		能够提供8个保护品种中药材的动态监测信息	完成指标任务，占比100%，但信息要素的齐全度仍需加强
		开展8个品种的监测技术人员技术培训	完成指标任务，占比100%
		开展保护品种的调查研究，提出8个有效解决办法	完成4个指标任务，占比50%

## (2) 项目资金使用的效果性评价

效果性绩效指标，包括（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标，可持续发展指标）。

表9 项目效果性评价情况汇总表

序号	项目类别	指标内容及口径	效果性评价情况
1	省级中医医院设备及修缮项目	医疗设备修缮	2个项目均完成指标任务，占比66.67%（广东省第二中医院维修维保了50余台/套设备；广州中医药大学第一附属医院完成修缮项目6项）
2	省市级中医院建设	对生态环境没有造成污染源	完成指标任务，占比100%
3	中医药信息化规划能力及应用水平建设	互联网医疗行业政策和知识水平、互联网医疗行业专题技术水平提升程度提升程度高，并提高过程监控和绩效评价的工作效率	完成指标任务，占比100%
		就医平均等候时间不超过15分钟	未完成，2个项目时间虽均超过15分钟但是比上一年度时间缩短
4	中医院治未病中心（平台）建设	服务总量增加	25个项目完成指标任务，占比80.65%
		服务总量提升	26个项目完成指标任务，占比83.87%
5	全省中医药适宜技术网络视频平台建设	指导基层中医药适宜技术推广视频网络平台与基地建设是否得到加强	3个项目均完成指标任务，占比100%
		基层常见病多发病中医药适宜技术推广视频网络平台与基地建设是否得到加强	19个项目完成指标任务，占比82.61%
6	全省中医类别医师资格实践技能	满足考试需要	完成指标任务，能够承担中医类别实践技能考试的具体工

	考试片区基地建设		作
7	综合医院中医药工作示范单位	年度诊疗人次比建设前年度诊疗人次增加 1%及以上	3 个项目完成指标任务，占比 60%（深圳市妇幼保健院、广州市第八人民医院增加 3%以上；中山市黄圃人民医院增加 2-1%）
		年度中药处方使用量比建设前年度中药处方使用量增加	4 个项目完成指标任务，占比 80%
		年度机构医护人员中医药知识知晓率比建设前年度医护人员中医药知识知晓率增加 20%及以上	4 个项目完成指标任务，占比 80%（深圳市妇幼保健院、广州市第八人民医院、阳江市人民医院增加 65%；中山市黄圃人民医院增加 50%）
8	中药特色技术传承人才培养	学习掌握中药特色技术和实践技术的程度优	18 个项目完成指标任务，占比 90%
		在实际工作推广使用的程度优	13 个项目完成指标任务，占比 65%
9	县区级中医临床技术骨干培训	县级中医院临床技术骨干临床诊疗能力提高程度	6 个项目均完成指标任务，占比 100%
10	国医大师学术思想传承	建立中医临床科研一体化的机制	3 个项目均完成指标任务，占比 100%
11	全国名中医传承工作室建设	制定传承培养计划，重点培养传承团队中不少于 1 名副高、不少于 2 名中级职称以上的中医药人员；培养外单位进修学习人员 3 人及以上	4 个项目均完成指标任务，占比 100%
		建立名老中医药专家管理制度	4 个项目均完成指标任务，占比 100%

		每年举办省级及以上中医药继续教育项目 1 次	4 个项目均完成指标任务，占比 100%
12	传染病中医药防治研究	中医药防治传染病的技术和方法推广应用	2 个项目均完成指标任务，占比 100%
13	第六批全国老中医药专家师承项目继承人经典理论培训	继承人理论水平提升程度	完成指标任务，占比 100%
		继承人临床技能提升程度	完成指标任务，占比 100%
14	全国基层名老中医药专家传承工作室继承人集中理论培训项目	继承人理论水平提升程度高	完成指标任务，占比 100%
		继承人临床技能提升程度高	完成指标任务，占比 100%
15	中医药管理机构人才及中医院管理人才培养	完成培训人数达标率为 100%	完成指标任务，占比 100%
16	中医住院医师（全科医生）规范化培训师资培养	中医医师、全科医师师资队伍培养能力加强程度高	完成指标任务，占比 100%
17	第三批省名中医师承	较好地继承了老中医药专家的学术经验和技術专长，服务患者	43 个项目完成指标任务，占比 86%
	第三批省名中医师承培训项目	提升继承人理论水平和临床技能程度高	完成指标任务，占比 100%
18	省名中医传承工作室建设	重点培养传承团队中不少于 1 名副高、不少于 2 名中级职称以上的中医药人员；培养外单	76 个项目完成指标任务，占比 95%

		位进修学习人员 3 人及以上	
		建立名老中医药专家管理制度	76 个完成指标任务，占比 95%
		每年举办省级及以上中医药继续教育项目 1 次	59 个项目完成指标任务，占比 73.75%
19	省名中医工作津贴	发放津贴	完成指标任务，占比 100%
20	中医药创新研究中心建设	中医药创新平台学科带头人的知名度和影响力进一步提高较强	5 个项目完成指标任务，占比 71.43%
		中医药科技创新能力得到有效提升	6 个项目完成指标任务，占比 86.71%
		形成中医药医产学研机制	完成指标任务，占比 100%
24	对外交流与合作	推进粤港澳大湾区中医药发展建设，吸引华侨华人来粤体验并传播中医药文化	完成指标任务，占比 100%
		能加强中医药对外宣传，促进中医药服务贸易发展	完成指标任务，占比 100%
	对外交流与合作项目（粤港澳大湾区中医药传承创新交流研讨）项目	-	未按时提交材料
25	省级中医药宣传平台（院）	-	未按时提交材料
	省级中医药宣传平台（局）	丰富宣传手段，提升广东中医药工作社会影响力	完成指标任务，占比 100%
26	中医药科普宣传	推动和促进中医药科普宣传	完成指标任务，占比 100%

	项目		
27	中医药文化宣传教育基地建设	成为当地中医药文化的重要展示场所，中医药文化的宣传阵地，向社会普及中医药知识	完成指标任务，占比 100%
28-1	科教评审、检查业务	促进我省中医药科教工作发展	6 个项目完成指标任务，占比 86.71%
28-2	中医药统计与信息化	完成指标任务	完成指标任务
28-3	传统医学师承和确有专长人员医师资格考核	维护我省传统医学师承和确有专长考核工作的严肃性，确保考核公平公正	完成指标任务，占比 100%
28-4	全省中医医术确有专长医师资格考核考试项目	落实中医药法，得到医师资格认可，提升中医药服务能力，建立我省考核长效机制，促进社会办医	完成指标任务，占比 100%
28-5	依法行政等管理工作项目	保障局机关日常工作	完成指标任务，占比 100%
29	动态保护	启动纳入《广东省岭南中药材保护条例》进行管理的相关程序	完成指标任务，占比 100%
30	人才培养	培养中药材生产、产地加工、质量控制、信息交流等方面急需紧缺的基层专业人才	完成指标任务，占比 100%
31	生产基地评估	加强岭南中药材保护	完成指标任务，占比 100%
32	文化保护	加强中医药保护和发展的	完成指标任务，占比 100%
33	资源动态监测	促进首批岭南中药材 8 个保护品种中药资源信息的即时收集和整理	完成指标任务，占比 100%

### (3) 项目资金使用的公平性评价

公平性绩效指标，主要考核满意度指标和事故发生率指标。在参加本次绩效自评工作的 707 个项目中，除去不参与产出和效益评价的面上科研项目（300）、重点科研项目（19）和单方验方科研项目（19），以及未按时提交材料的项目（11）和驳回后未提交（14）后的 354 个项目中共有 267 个项目开展了满意度评价或者事故发生率评价，占比 75.42%，满意度  $\geq 90\%$  的项目数占比为 90.64%，可以反映出 2018 年省医疗卫生健康事业发展专项资金（传承发展中医药事业）项目的服务对象满意度较高。

表 10 项目公平性评价情况汇总表

序号	项目类别	项目数	开展评价项目数	评价结果
1	省级中医医院设备及修缮项目	3	3	满意度率均 $\geq 90\%$
2	省市级中医院建设	3	3	均未发生事故
3	中医药信息化规划能力及应用水平建设	4	2	满意度率均 $\geq 90\%$
4	中医院治未病中心（平台）建设	30	22	满意度率均 $\geq 90\%$
5	全省中医药适宜技术网络视频平台建设	22	13	10 个项目的满意度率 $\geq 90\%$
6	全省中医类别医师资格实践技能考试片区基地建设	4	1	满意度率 $\geq 90\%$
7	综合医院中医药工作示范单位	5	4	3 个项目的满意度率 $\geq 90\%$
8	中药特色技术传承人才培养	20	5	3 个项目的满意度率 $\geq 90\%$
9	县区级中医临床技术骨干培训	6	4	满意度率均 $\geq 90\%$
10	国医大师学术思想传承	3	1	满意度率 $\geq 90\%$

11	全国名中医传承工作室建设	4	3	满意度率均 $\geq 90\%$
12	传染病中医药防治研究	2	1	满意度率 $\geq 90\%$
13	第六批全国老中医药专家师承项目继承人经典理论培训	1	1	满意度率 $\geq 90\%$
14	全国基层名老中医药专家传承工作室继承人集中理论培训项目	1	1	满意度率 $\geq 80\%$
15	中医药管理机构人才及中医院管理人才培训	1	1	满意度率 $\geq 90\%$
16	中医住院医师(全科医生)规范化培训师资培养	1	1	满意度率 $\geq 90\%$
17	第三批省名中医师承	48	31	30个项目的满意度率 $\geq 90\%$
	第三批省名中医师承培训项目	1	1	满意度率 $\geq 90\%$
18	省名中医传承工作室建设	77	64	61个项目的满意度率 $\geq 90\%$
19	省名中医工作津贴	80	80	满意度率 $\geq 90\%$
20	中医药创新研究中心建设	7	3	满意度率均 $\geq 90\%$
24	对外交流与合作	4	4	均遵守有关文物保护和自然保护法律法规,为造成景观损坏
	对外交流与合作项目(粤港澳大湾区中医药传承创	-	-	未按时提交材料



	新交流研讨)项目			
25	省级中医药宣传平台 (广州中医药大学第一附属医院)	-	-	未按时提交材料
	省级中医药宣传平台 (广东省中医药局)	1	1	满意度率 $\geq 90\%$
26	中医药科普宣传项目	1	1	满意度率 $\geq 90\%$
27	中医药文化宣传教育基地建设	13	8	3个项目的满意度率 $\geq 90\%$
28-1	科教评审、检查业务	7	5	满意度率均 $\geq 90\%$
28-2	中医药统计与信息化	1	1	满意度率均 $\geq 90\%$
28-3	传统医学师承和确有专长 人员医师资格考核	1	-	未开展
28-4	全省中医医术确有专长医 师资格考核考试项目	1	1	满意度率 $\geq 90\%$
28-5	依法行政等管理工作项目	1	1	满意度率 $\geq 90\%$
29	动态保护	1	1	满意度率 $\geq 90\%$
30	人才培养	-	-	未开展
31	生产基地评估	-	-	未开展
32	文化保护	1	1	满意度率 $\geq 90\%$
33	资源动态监测	1	1	满意度率 $\geq 90\%$
合计:		354	267	242个项目满意度率 $\geq 90\%$

### （三）存在的问题

#### 1、 自评材料提交情况有待进一步加强

根据自评工作的要求，评价工作小组在现行的广东省省级中药建设专项资金监控与绩效评价系统中搜集、整理了项目承担单位提交的自评材料，对项目单位上报的相关自评材料进行统计及分析。在项目自评材料提交期间，评价工作小组多次督促地市卫计局及省属单位及时上报材料，但部分地市仍存在上报材料不及时、配合程度不高等问题，主要存在问题情况如下：

##### （1）项目单位未能严格按文件要求及时报送自评材料

参加本次绩效自评工作共有 194 个资金使用单位，707 个项目。根据《关于做好 2018 年省医疗卫生健康事业发展专项资金（传承发展中医药事业）项目绩效评价工作的通知》（粤中医办函〔2019〕86 号），各单位项目自评材料的汇总上报时间为 2019 年 7 月 30 日。截至 2019 年 8 月 15 日，仍有 8 个单位，11 个项目未报送自评材料。

##### （2）报送的自评材料不齐全

截至 2019 年 8 月 15 日，仍有 8 个单位，14 个项目报送的自评材料（如自评表、自评报告、佐证材料和预算支出明细表等）存在上报材料不齐全问题，如部分项目单位仅报送自评表，却未提供相关佐证材料，部分项目单位自评报告未按格式要求填写，以及部分项目单位材料驳回后未及时更正提交的。

#### 2、 项目类别之间的资金完成率差异较大。

##### （1）项目类别的资金完成率差异较大

在 2018 年省医疗卫生健康事业发展专项资金（传承发展中医药事业）项目所涵盖的六个方向中，中医药服务体系建设和中医药文化与对外合作交流方向的资金实际使用率较高均接近 90%，而在六大板块中岭南中药材保护方向的资金实际使用率最低不足 20%。结合上述表 7（1-4），可知在 33 类 44 小类项目中除去未按时提交材料无法统计的项目后，仍有 5 小类项目存在严重的支付进度滞后情况：**生产基地评估项目**（经费使用单位撤编，资金冻结，实际支出率为 0）、**人才培养项目**（实际支出率 < 15%）、**文化保护项目**（实际支出率 < 15%）和**第三批省名中医师承项目**（实际支出率 < 15%）、**广东省中医医术确有专长医师资格考核项目**（实际支出率 < 15%）。具体情况详见表 13-1 和 13-2。

表 13-1 各板块项目资金实际支出情况

序号	隶属方向名称	预算金额 (万元)	支出金额 (万元)	支出率 (%)
1	中医药服务体系建设	9908	8857.55	89.40
2	中医药服务能力建设	4820	2932.1882	65.60
3	中医药人才建设及传承创新	3330	1743.2071	54.47
4	中医药文化与对外合作交流	660	571.4325	89.29
5	中医药专项建设工作	848	475.7094	58.87
6	岭南中药材保护	500	94.7264	18.95

表 13-2 实际支出率过低项目明细汇总情况表

序号	项目类别	项目承担单位	支出金 额(万元)	支出率 (%)	原因
2	省市级中医院建设	潮州市中医医院	0	0	严格按照潮州市财政局相关文件规定和原定的建设计划,并将工程量送交有关部门审核
3	中医药信息化规划能力及应用水平建设	广东省第二中医院	9.55	15.92	绩效指标制定迟缓,导致系统建设进度稍有缓慢
4		阳江市中西医结合医院	20	20	资金使用报批周期长,且有些设备还未采购到位

序号	项目类别	项目承担单位	支出金额(万元)	支出率(%)	原因
		江海区中西医结合医院	0.458	0.46	原计划的修缮房屋和购买设备均为开工
		南沙区中医医院	0.11	0.11	资金使用规范的同时招标耗时长
		陆河县中医院	0	0	前期准备 2018 年中医药迁建(升级)项目搁置本项目的建设,于 2019 年 1 月重启现已完成项目招标工作,但因所购设备未到位,所以未申请验收和支付
		陆丰市中医院	---	---	未按时提交材料
		广东省中西医结合医院(南海区中医院)	0	0	计划到资金落实周期长,地方财政部门和项目承担单位对项目资金使用范围和标准的理解、把握不一致
		曲江区中医院	0	0	暂未使用专项资金支付设备及装修费用
		连南瑶族自治县中医院	0	0	医院重新选址建设,项目尚未开展
		清新区中医院	0	0	目尚未开展,未能及时按照计划时间使用资金
	中医院治未病中心(平台)建设	广东省第二中医院黄埔医院	36.1762	36.18	已完成第一阶段的体检中心改造工程,后续结余的 63.82 万元,主要用于采购治未病专用设备,进一步提高治未病的服务质量。

序号	项目类别	项目承担单位	支出金额(万元)	支出率(%)	原因
		广州中医药大学第三附属医院	32.78	32.78	设备购置招标时间过长,影响设备投入使用
5	全省中医药适宜技术网络视频平台建设(省级基地)	广州中医药大学第一附属医院	24.6991	49.4	临床工作任务繁重、涉及的专家及助手人数多,拍摄时间协调难度大,故未能在当年完成全部操作示范的拍摄
		潮南区人民医院	15.5088	38.77	仅支付承建公司的进场款,未说明后续资金的使用计划
	全省中医药适宜技术网络视频平台建设(县级平台)	清城区中医院	12.59	31.48	与中国联合网络通信有限公司清远市分公司签订《关于清城区中医药适宜技术视频网络平台建设项目》的合同,根据合同根据合同及项目进度支付款项,于2018年12月20日仅支付30%款项。
		云城区腰古中心卫生院	7.434	18.59	由于被纳入云浮市基层医疗改造卫生院,原计划建设平台区域发生更改需向多个部门办理续建手续,延后了建设进度。目前工程已完成相关手续,进入招投标阶段,预计今年10月上旬投入使用。
		江城区人民医院	0	0	有详细的预算和资金使用

序号	项目类别	项目承担单位		支出金额(万元)	支出率(%)	原因
						计划,但未说明为何未使用
		阳东区人民医院		0	0	正在筹备招标环节,初步通过区招标办审核环节
6	全省中医类别医师资格实践技能考试片区基地建设	佛山市中医院		21.1557	21.16	新考场第一版方案改建费用远超项目支持费用,后于2019年初调整了方案而实施时间有所延迟,未达预定指标,并且因调整方案,导致第一个方案设计费用有所损耗;由于使用部门为医务科、但支出费用的管理部门为财务科、科教科、后勤管理科、设备科等,因此资金的管理难于实时统计,目前均为事后回顾统计。
7	综合医院中医药工作示范单位	中山市黄圃人民医院		24.98	49.96	部分预算项目实施进度较慢、资金使用范围狭窄以及中西医科室之间协作问题
		阳江市人民医院		0	0	前期设备购买工作进展受阻,截止2019年3月31日,到位资金未能及时支出
8	中药特色技术传承人才培养	广东省中西医结合医院(南海区中医院)	吴永林、袁联华	1.22	20.33	因项目周期为3年,2016-2018年均有下达资金,2018年前期仍在使用的2017年剩余经费,故2018年经费截止至3月使用率不高

序号	项目类别	项目承担单位		支出金额(万元)	支出率(%)	原因
		广东药科大学	潘利明	0	0	本项目经费于2019年4月8日才到达培养对象(潘利明)账号,致使之前的培训费用均未从本项目支出。
11	全国名中医传承工作室建设	广东省第二人民医院	邱健行	4.3	8.6	审批程序过于复杂,耗时长
17	第三批省名中医师承	广东省第二人民医院	高敏	0.45	0.075	-
			刘文刚	0.45	0.075	-
			陈宁	0.45	0.075	-
		广东省人民医院	叶安娜	0.055	0.0092	-
			广州中医药大学	范瑞强	0.02	0.0033
		广州中医药大学	林定坤	0	0	-
			艾宙	0.09	0.015	-
		广东药学院	洪敏	0	0	-
		南方医科大学	贾钰华	0	0	项目下达到南方医科大学中西医结合医院,经费是直接下达到南方医科大学;大学这边没有文件无法进行经费认领,导致此项经费在落户到贾钰华名下的时候有些耽搁,加上文件中表明的支出范围比较笼统,在财务报账的时候又经过了几轮审批,所以截止8月底未完成支出。

序号	项目类别	项目承担单位		支出金额(万元)	支出率(%)	原因
		广州医科大学	邬晓东	0	0	前期未有外出学习的项目,因此目前的师承经费尚未使用
		广州市中西医结合医院	龙德	0.4	0.0667	-
		深圳市中医院	李浩	0	0	前期未有外出学习的项目,因此目前的师承经费尚未使用
		南山区人民医院	黄胜光	0	0	-
		佛山市中医院	曾莺	0	0	-
		佛山市第二人民医院	张卫华	0	0	购买书籍未开具发票,因此暂未能入账
		惠州市中心人民医院	钟启腾	0	0	-
		中山市中医院	李燕林	0	0	单位经费使用计划在2019年3月以后
			赖海标	0	0	-
		信宜市中医院	陈永炎	0.0984	0.0164	-



序号	项目类别	项目承担单位		支出金额(万元)	支出率(%)	原因
		清远市妇幼保健院	曾宪进	0	0	单位经费使用计划在2019年3月以后
		兴宁市中医院	杨郎	0.127	0.0212	-
		高州市中医院	李鳌才	0	0	资金尚未到位,无法进行使用。该院提供凭据并说明,高州市财政局2019年9月18日将经费下达到高州市中医院。
		惠来县慈云中医院	胡水勋	0	0	财政划拨专项资金实际到位时间较晚,资金支出进度相对滞后。
18	省名中医传承工作室建设	广东医科大学附属医院	莫通工作室	-	-	材料驳回后未上交
		深圳市中医院	杨卓欣工作室	0.9	9	-
		肇庆市中医院	谢少龙工作室	0.8	8	-
		广东省第二人民医院	谢波工作室	1.9	19	-
		阳江市中医院	冯小燕工作室	1.937	19.37	由于自身原因,资金使用较慢
		广东省中西医结合	廖志山工作室	1.1243	11.24	-

序号	项目类别	项目承担单位	支出金额(万元)	支出率(%)	原因
		结合医院(南海区中医院)			
		汕头市林创坚工作室 中医院	1.6	16	-
		海丰县柯青工作室 中医院	-	-	未按时提交材料
		广州中医药大学顺德黄枫工作室 医院(顺德区中医院)	1.18079	11.81	项目的资金在早期下达至佛山中医院,致使资金下达至本院的时间较正常延后1年,加上资金的申请审批周期较长,导致资金的使用较慢。
		湛江市蔡柏工作室 第一医院	0.921	9.21	-
		珠海市刘志龙工作室 中西医结合医院(珠海市第二人民医院)	0.633	6.33	-
		东莞市蔡立民工作室 中医院	0.6685	6.69	因仪器设备等软硬件购置手续繁琐、行政流程需时较长时间,因此资金使用迟缓

序号	项目类别	项目承担单位	支出金额(万元)	支出率(%)	原因
		叶小汉工作室	0.04	0.4	因仪器设备等软硬件购置手续繁琐、行政流程需时较长时间，因此资金使用迟缓
		中山市中医院 李旭工作室	0	0	工作室工程项目尚未完工，工程款未结算，所以暂无经费支出
		中山市中医院 陈金泉工作室	0	0	工作室工程项目尚未完工，工程款未结算，所以暂无经费支出
		惠州市中医院 陈洪工作室	0	0	资金使用效率低的原因在流程管理，专项资金预算、支出、招标采购等周期较长
		顺德区第一人民医院 龙倩玲工作室	0	0	医院搬迁，工作室转移到新医院，因此工作室的安排有延迟和改进
		韶关市中医院 黄献民工作室	0	0	2017年资金有结余，先使用的是结余资金
		中山大学附属第三医院 杨宏志工作室	0	0	综合医院由于之前没有传承中医药发展事业相关项目，职能部门和临床科室无中医传承资金使用相关经验，审批及报销过程遇到困难，导致资金使用进度
		广东省第二人民医院 梁兆球工作室	0	0	安排这部分资金用于学习设备配置、论文的发表、专著的撰写及出版上，所需时间较长，所以截止2019年

序号	项目类别	项目承担单位	支出金额(万元)	支出率(%)	原因
					3月31号前, 资金尚未支出
		茂名市张帆工作室	-	-	材料驳回后未上交
		中医院黎治荣工作室	0	0	-
		潮州市林汉森工作室	0	0	-
20	中医药创新研究中心建设	广东药科大学	4.75	14.39	耗材是先发货后报销转账, 导致资金报销使用进度相对延后。
		郭姣	0	0	经费用于购买一套自动微生物鉴定分析系统, 购买的设备已到货但是由于设备尚未验收, 经费尚未支出
25	省级中医药宣传平台	广州中医药大学第一附属医院	-	-	未按时提交材料
27	中医药文化宣传教育基地建设	肇庆市中医院	4.2325	42.33	资金使用进度较慢, 统筹较不合理
		化州市中医院	0	0	前项目尚未进入施工建设阶段, 项目建设难度大
		无限极(中国)有限公司新会生产基地	0	0	新会生产基地项目项目进展缓慢, 截止至2019年3月31日本项目进展至采购需求确认
		清远市卫生健康局	0	0	目前正在图纸设计和工程预算阶段, 尚未支付项目资

序号	项目类别	项目承担单位	支出金额(万元)	支出率(%)	原因
					金, 预计 10 月前完成工程并支付建设资金
		龙岗区中医院	0	0	由于医院按年度使用资金, 跨年度项目导致专项资金未能按期支付
28-3	传统医学师承和确有专长人员医师资格考核	广州中医药大学继续教育学院	10.9345	36.45	15 万遗留资金是因 2018 年师承人员考试无考生报名, 因此无需进行师承人员考核工作, 故未做使用。
28-4	全省中医医术确有专长医师资格考核考试项目	广州中医药大学继续教育学院	1.6343	1.02	由于本项目为全国先例, 工作尚未开展, 且无法估算报考人数, 因此在划拨经费与参加考试考生人数存在差异
34	人才培养	广州中医药大学	6.2005	12.4	存在资金调整问题
35	生产基地评估	广东省中医药科技发展交流中心	资金冻结	0	广东省中医药科技发展交流中心开展项目过程中, 基地调研及评估系统开发等重点内容集中在后期, 因而使得资金使用也大量集中在项目后期。
36	文化保护	广东省中医药博物馆	10.7805	5.39	经费于 2018 年 6 月 11 日到账, 绩效报告评价基准日截止至 2019 年 3 月 31 日, 未到 1 年

序号	项目类别	项目承担单位	支出金额(万元)	支出率(%)	原因
37	资源动态监测	广州中医药大学	42.5168	35.43	(1) 广州中医药大学近期对此类专项管理政策有变,一定程度上致使项目难以照原计划实施。(2) 各市、县中医药局,农业及其他相关部门对本项目知情度或重视度普遍不够,部分企业配合度亦较低,限制了部分工作的开展。(3) 专项负责人身体抱恙3月余,期间未能及时处理项目事务,使项目开展与经费使用受延。

### 3、项目在实际开展过程中存在一定的实施困难

(1) 有关于设备修缮及建设性的项目,多反映存在设备购置或者建设等招标时间过长,影响设备投入使用和建设开展的问题,以及保证各类建设和设备运营符合需求,合同尾款需要在建设验收后支付,导致的资金支付滞后的问题。

(2) 中医院治未病中心(平台)建设存在平台建设未开展和“治未病”工作发展受限的问题。部分项目承担单位反映其“治未病”服务人数发展存在瓶颈阶段,治未病科服务人次相对往年有增长减缓趋势,可能因为中医治未病在群众中知晓率较低,群众就诊意愿不高。

(3) 全省中医药适宜技术网络视频平台建设反应在实施过程中存在省级项目单位与县级基地信息沟通不足、县级基地设备运作困难,对执行检查评估要求较为吃力、县级项目单位中医药师资欠缺的同时兼并着繁重的临床工作任务,难以持续性开展培训和评价参训人员学习后用于临床实践的效果,以及技术平台教学多集中于理论教学,如何将加强现场实操教学,让学员真正掌握中医适宜技术并应用到日常工作去,充分发挥中医药适宜技术在基层防治常见病多发病中的优势和作用是下一步平台建设发展的方向。

(4) 全省中医类别医师资格实践技能考试片区基地建设项目中，部分考场反映由于场地和资金的限制使其考站、考组的基地建设只能设在非固定场所，难以满足未来一年多考的需求。

(5) 中药特色技术传承人才培养项目中，部分考场反映由于培养对象多身处一线窗口部门，工作繁忙难于抽出时间外出培训以致游学轮时间难以安排转，次数不足，同时项目的实施效果也会受到其他因素如中药特色技术在基层中医院缺乏开展的条件的影晌出现偏差。

(6) 县区级中医临床技术骨干培训项目中，部分项目单位反映由于基层医疗机构医务人员匮乏，临床工作任务较重，虽学员有积极学习的愿望，但依旧无法按照原定计划参加培训。

(7) 第三批省名中医师承项目普遍存在资金使用严重滞后的问题，多数项目承担单位反映因对财政资金可使用的范围和使用流程不够清晰和明了、使用流程欠完善等原因影响专项资金的使用。

(8) 中医药创新研究中心建设项目中，部分项目单位反映因申请医院制剂和中药新药需要完成大量前期的临床前研究，耗时较长，且注册申请流程也较长，建设效果有待提高。

(9) 资源动态监测项目经费执行效率较低的原因：广州中医药大学科研处提供资源动态监测执行效率低的理由如下：广州中医药大学近期对此类专项管理政策有变，一定程度上致使项目难以照原计划实施。各市、县中医药局，农业及其他相关部门对本项目知情度或重视度普遍不够，部分企业配合度亦较低，限制了部分工作的开展。专项负责人身体抱恙 3 月余，期间未能及时处理项目事务，使项目开展与经费使用受延。

#### 4 其他情况

2018 年省级中医药建设项目绝大多数都是严格按照省中医药局印发的《中医药部门专项资金项目工作任务方案》及相关要求实施的，但也有部分项目存在调整情况：如广东省中医医术确有专长医师资格考核项目由于项目实施情况特殊，全国均为开展此工作，且无法估算报考人数信息等原因，专项经费使用严重滞后。

### 三 改进意见

#### (一) 解决自评材料未交或资料不完整问题的建议

建议可以开展有关材料上报系统的使用步骤等相关的培训,规范上报材料内容的填写,最大限度避免留空或漏填、错填内容的情况,项目承担单位的负责人应认真阅读专项资金绩效评价自评报告的填写要求,并严谨相关按规定完成填写;各级上级部门应及时督促项目单位按要求和按时完成项目的绩效自评。

#### (二) 经济性评价的建议

1、建议各项目承担单位尽按要求完善资金使用计划。特别是像省级中医院设备及修缮等常规性拨款项目,可在严格根据省中医药局出台的当年项目实施方案要求的情况下,在资金未到位之前,制定加快资金使用进度和周转率,加强绩效管理,进一步提高经济效益和社会效益。

2、建议科学合理编制和设定资金项目,不断完善各项报批程序,做好项目前期工作;建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制,严格预算执行和强化预算监督管理,提高资金的使用效益确保资金专款专用;加大资金使用情况信息化建设的投入和力度,使得项目在运行中获得有效的自我管理,也使专项的资金管理更加细化和清晰。

3、科学研究活动存在其自有的发展规律,合理的科研资金使用规划有助于科研活动的开展。科研专项资金管理者应细化管理,做好预算计划,按需合理使用经费。

4、尽快形成对遗留资金的处理方案报告。介于2018年省医疗卫生健康事业发展专项资金(传承发展中医药事业)项目存在部门资金未使用的情况,相应的项目承担单位应尽快与广东省中医药局各主管处协商,形成对遗留资金的初步处理方案报告,向广东省中医药局报备。

5、地市专项资金主管部门应提高资金下拨效率,并加大对资金到位情况的监督力度,以保证资金到位的及时率,使项目单位的工作可以按时有序开展。

#### (三) 效率性评价的建议

1、如省级中医医院设备及修缮项目等常规性年度项目,项目承担单位可以



尝试提前做好准备工作，如立项论证、市场调研、进行产品进口论证等工作，待指标下达后，即可进行政府采购网报备等工作，以缩短当年办理设备采购时间，加快资金的使用进度。

2、各类项目可根据自身的建设周期做出项目的建设计划，完善项目的建设方案，设定每个建设环节应完成的时间点，而项目领导小组加紧对各个环节建设周期的督促和管控。

#### **（四）效果性评价的建议**

1、建议以治未病服务平台为出发点，以各大特色“治未病”服务技术联盟为基础，持续举办面向基层“治未病”医务工作者的继续教育项目，向基层输出简便验廉的中医诊疗技术，大力发展中医药人才培养，进一步推进常用中医技术在科室的使用和基层推广。同时转变服务理念，加强宣传和推广治未病服务，突出中医药特色，发挥中医药优势，拓宽服务领域，提高服务能力，探索新的服务模式，充分发挥中医药临床服务独特作用，构建中医药特色服务体系，推进现代医院管理和传统医学服务能力的结合，打造一支有力的传统医学和现代医学相结合团队，改善就医流程和群众体验。

2、考试基地的建设项目建议能进一步得到财政资金支持，以建成固定且集中的考试场所，配备智能化考务管理系统和先进的信息化设备，提高考试效率，确保考试公平公正。

3、师承类项目中关于学习经典书籍理论的建议可以组织资深专家通过论证后推荐经典书籍，包括书名、作者、版本、出版社等，形成统一的“传承项目教材”，从而避免盲目购书和学习，这便于对学习效果进行考核；同时建议上级主管部门可根据不同专业统一遴选师承导师，确定跟师规则，学员们可以根据自身情况有目的的选择导师并加以学习，从而使中药特色技术得到真正传承。

4、各类培训项目建议加大项目之间的沟通联系，设定各自统一的授课师资和内容，以避免基地间授课内容的重复，影响学习效果；该类项目容易出现经费紧张的问题，建议后续的项目应调整经费预算的测算依据，合理拨款；同时各参与单位及其领导可以提高对培训的支持力度，促使培训类项目可以按时按质的完成。

5、各类名中医工作室之间多为独立运作，相互之间交流少，建议可以通过

建立中医药传承人才教育流动站的形式，相互间接收或派送人员进修，促进相互间的交流学习和科研互动，培养更多的中医人才；建议利用现代化技术，建立名老中医经验数据库，并在名老中医工作室之间实现网络资源共享，使名老中医的临床经验、学术思想，代代相传下，后继有人，后继有术。

#### **（五）公平性评价存在的建议**

公平性指标评价是衡量各类项目建设完善与否的重要衡量指标，项目承担单位在执行相应项目建设任务的同时，应重视公平性指标的评价，积极拓展公平性指标内涵，及时有效、多维度的开展满意度调查，保证专项资金的合理使用。

## 附录 1

表 14 初评专家名单

序号	工作单位/部门	姓名	职称
1	广州中医药大学附属骨伤科医院	黄宏兴	教授
2	广州中医药大学经济与管理学院	袁冬生	研究员
3	广州中医药大学审计处	黄永	研究员
4	广东药科大学	徐梦丹	副教授
5	广州中医药大学经济与管理学院	许星莹	副教授
6	广州中医药大学科技处	曹越	副研究员
7	广州中医药大学第一附属医院	曾征伦	副研究员
8	广州中医药大学科技处	张坚	副研究员
9	广州中医药大学经济与管理学院	庆艳华	讲师
10	广州中医药大学经济与管理学院	谭红玲	讲师
11	广州中医药大学经济与管理学院	张彩霞	讲师

附录 2

表 15 现场评价领导和专家名单

序号	工作单位/部门	姓名	职务/职称
1	广东省中医药局规财（人事）处	刘木才	处长
2	广东省中医药局规财（人事）处	李新	科长
3	广州中医药大学第一附属医院	朱敏	副院长
4	广州中医药大学第一附属医院	黄少瑜	处长
5	广东省中医院	胡学军	副处长
6	广州中医药大学附属骨伤科医院	黄宏兴	教授
7	广州市中医医院	肖斌	副院长
8	广东省中西医结合医院	谢兵	院长
9	湛江市第二中医医院	肖波	院长/主任医师
10	广东省第二中医院	依华	财务科长
11	广州中医药大学第一附属医院	王红艳	高级审计师
12	广州中医药大学	何清生	处长
13	广州中医药大学	周正旭	副处长
14	广州中医药大学科技处	张坚	副研究员
15	广州中医药大学经济与管理学院	袁冬生	研究员
16	广州中医药大学经济与管理学院	许星莹	副教授
17	广州中医药大学经济与管理学院	庆艳华	博士/讲师

## 附录 3

表 16 现场绩效评价项目名单及其安排情况表

资金项目	项目单位	项目属地	项目金额 (万)	现场核查 地点、时间
省级中医医院设备及修缮项目	广东省中医院	广东省	2926.0	广东省中 医院 9月5日(周 四)
中医院治未病中心(平台)建设(省级“治未病”指导中心)	广东省中医院	广东省	100.0	
全省中医药适宜技术网络视频平台建设(省级基地)	广东省中医院	广东省	50.0	
县区级中医临床技术骨干培训	广东省中医院	广东省	10.0	
全国名中医传承工作室建设(林毅工作室)	广东省中医院	广东省	50.0	
中医住院医师(全科医生)规范化培训师资培养	广东省中医院	广东省	60.0	
科教评审、检查业务	广东省中医院	广东省	2.0	
第三批省名中医师承(张忠德)	广州中医药大学	广东省	6.0	
中医药创新研究中心建设	广东药科大学	广东省	33.0	
对外交流与合作	广州白云山和记黄埔中药有限公司神农草堂中医药博物馆	广州市	15.0	
中医药文化宣传教育基地建设	广州白云山中一药业有限公司	广州市	10.0	
第六批全国老中医药专家师承项目继承人经典理论培训	广州中医药大学	广东省	17.0	

全国基层名老中医药专家传承工作室继承人集中理论培训项目	广州中医药大学	广东省	18.0	广州中医药大学第一附属医院 9月6日(周五)
资源动态监测	广州中医药大学	广东省	120.0	
第三批省名中医师承培训项目	广州中医药大学继续教育学院	广东省	30.0	
省级中医医院设备及修缮项目	广州中医药大学第一附属医院	广东省	2850.0	
中医院治未病中心(平台)建设(省级“治未病”指导中心)	广州中医药大学第一附属医院	广东省	100.0	
县区级中医临床技术骨干培训	广州中医药大学第一附属医院	广东省	10.0	
国医大师学术思想传承(周岱翰)	广州中医药大学第一附属医院	广东省	25.0	
全国名中医传承工作室建设(欧阳惠卿工作室)	广州中医药大学第一附属医院	广东省	50.0	
省级中医药宣传平台	中国中医药报记者站	广东省	20.0	
省级中医医院设备及修缮项目	广东省第二中医院	广东省	855.0	
中医院治未病中心(平台)建设(省级“治未病”指导中心)	广东省第二中医院	广东省	100.0	
省名中医传承工作室建设(汪何工作室)	广东省第二中医院	广东省	10.0	
省名中医传承工作室建设(许学猛工作室)	广东省第二中医院	广东省	10.0	
省名中医传承工作室建设(谢波工作室)	广东省第二中医院	广东省	10.0	

生产基地评估	广东省第二中医院	广东省	80.0	
第三批省名中医师承(刘颖)	广东省妇幼保健院	广东省	6.0	
中药特色技术传承人才培训	广州市中医医院	广州市	3.0	
综合医院中医药工作示范单位	中山大学附属第一医院	广东省	50.0	
中医院治未病中心(平台)建设(治未病平台)	东莞市虎门中医院	东莞市	100.0	东莞市虎门中医院 9月9日(周一)
中医院治未病中心(平台)建设(治未病平台)	龙岗区中医院	龙岗区 (深圳)	100.0	
省名中医传承工作室建设(彭力平工作室)	深圳市中医院	深圳市	10.0	
第三批省名中医师承(黄胜光)	南山区人民医院	南山区卫 生健康局 (深圳)	6.0	
省名中医传承工作室建设(陈洪工作室)	惠州市中医院	惠州市	10.0	
中医药文化宣传教育基地建设	惠州市卫生健康局	惠州市	10.0	
省名中医传承工作室建设(钟强)	河源市中医院	河源市	10.0	
省市级中医院建设	广州中医药大学第三附属医院	广东省	1000.0	广州中医药大学第三附属医院 9月10日 (周二)
中医院治未病中心(平台)建设(省级“治未病”指导中心)	广州中医药大学第三附属医院	广东省	100.0	
中医院治未病中心(平台)建设(治未病平台)	海珠区中医医院	海珠区 (广州)	100.0	

省名中医传承工作室建设 (梁兆球工作室)	广东省第二人民医院	广东省	10.0	
综合医院中医药工作示范 单位	广州市第八人民医院	广州市	50.0	
传染病中医药防治研究	广州市第八人民医院	广州市	20.0	
中医院治未病中心(平台) 建设(治未病平台)	广州市正骨医院	越秀区 (广州)	100.0	
科教评审、检查业务	佛山市中医院	佛山市	2.0	
省名中医传承工作室建设 (龙倩玲工作室)	顺德区第一人民医院	顺德区 (佛山)	10.0	
第三批省名中医师承	肇庆市中医院	肇庆市	6.0	
第三批省名中医师承(吴 社泉)	肇庆市中医院	肇庆市卫 生健康局	6.0	
第三批省名中医师承(陈 泽雄)	中山大学	广东省	6.0	
第三批省名中医师承(张 诗军)	中山大学	广东省	6.0	
中医药管理机构人才及中 医院管理人才培养	中山大学	广东省	30.0	
对外交流与合作项目(粤 港澳大湾区中医药传承创 新交流研讨)项目	人之初杂志社	广东省	20.0	
全省中医药适宜技术网络 视频平台建设(县级平台)	中山市中医院	中山市	40.0	
省名中医传承工作室建设 (陈金泉工作室)	中山市中医院	中山市	10.0	
中医院治未病中心(平台) 建设(省级“治未病”指 导中心)	广东省中医院珠海医 院	广东省	100.0	



2018年县区级中医医院信息化规划能力及应用水平建设项目	江门市五邑中医院恩平分院	恩平市 (江门)	100.0	曲江区人民医院(中医院) 9月11日 (周三)
全省中医类别医师资格实践技能考试片区基地建设	江门市中医药高等职业学院	江门市	100.0	
中医院治未病中心(平台)建设(治未病平台)	曲江区中医院	曲江区 (韶关)	100.0	
中医院治未病中心(平台)建设(治未病平台)	仁化县中医院	仁化县 (韶关)	100.0	
省名中医传承工作室建设(黄献民工作室)	韶关市中医院	韶关市	10.0	
省名中医传承工作室建设(饶振芳工作室)	韶关市粤北人民医院	韶关市	10.0	清远市中医院 9月12日 (周四)
第三批省名中医师承(曾宪进)	清远市妇幼保健院	清远市	6.0	
省名中医传承工作室建设(黄宗良工作室)	清远市中医院	清远市	10.0	
中医院治未病中心(平台)建设(治未病平台)	清新区中医院	清新区 (清远)	100.0	
全省中医药适宜技术网络视频平台建设(县级平台)	清新区人民医院	清新区 (清远)	40.0	
中医院治未病中心(平台)建设(治未病平台)	连南瑶族自治县中医院	连南瑶族自治县 (清远)	100.0	
全省中医药适宜技术网络视频平台建设(县级平台)	连山壮族瑶族自治县人民医院	连山壮族瑶族自治县 (清远)	40.0	
全省中医药适宜技术网络视频平台建设(县级平台)	连南瑶族自治县人民医院	连南瑶族自治县	40.0	

		(清远)		
全省中医药适宜技术网络视频平台建设(县级平台)	云安区人民医院	云安区 (云浮)	40.0	江城区人民医院(阳江) 9月16日 (周一)
全省中医药适宜技术网络视频平台建设(县级平台)	云城区腰古中心卫生院	云城区 (云浮)	40.0	
中医药文化宣传教育基地建设	阳春市中医院	阳春市 (阳江)	10.0	
全省中医药适宜技术网络视频平台建设(县级平台)	阳东区人民医院	阳东区 (阳江)	40.0	
全省中医药适宜技术网络视频平台建设(县级平台)	江城区人民医院	江城区 (阳江)	40.0	
省名中医传承工作室建设 (黎治荣工作室)	茂名市中医院	茂名市	10.0	湛江市第一中医院 9月17日 (周二)
省名中医传承工作室建设 (张帆工作室)	茂名市中医院	茂名市	10.0	
省市级中医院建设	湛江市第一中医院	湛江市	1000.0	
全省中医类别医师资格实践技能考试片区基地建设	湛江中医学校	湛江市	100.0	
中医药文化宣传教育基地建设	湛江市卫生健康局	湛江市	20.0	
省名中医传承工作室建设 (莫通工作室)	广东医科大学附属第一医院	湛江市	10.0	
中医药文化宣传教育基地建设	南寿峰健康产业园	梅县区 (梅州)	10.0	梅州市中医院(田家炳医院) 9月16日 (周一)
第三批省名中医师承(杨郎)	兴宁市中医院	兴宁市 (梅州)	6.0	
中医院治未病中心(平台)建设(治未病平台)	梅州市中医院(田家炳医院)	梅州市	100.0	
省市级中医院建设	潮州市中医院	潮州市	1000.0	潮州市中

省名中医传承工作室建设 (林汉森工作室)	潮州市中医院	潮州市	10.0	医院 9月17日 (周二)
中医药文化宣传教育基地 建设	广东太安堂药业股份 有限公司	汕头市	20.0	
全省中医药适宜技术网络 视频平台建设(县级平台)	龙湖人民医院	龙湖区 (汕头)	40.0	
第三批省名中医师承(胡 水勋)	揭阳惠来县慈云中医 院	南山区 (揭阳)	6.0	
全省中医药适宜技术网络 视频平台建设(县级平台)	榕城区梅云社区卫生 服务中心	榕城区 (揭阳)	40.0	
省名中医传承工作室建设 (卢永兵工作室)	揭阳市中医院	揭阳市	10.0	
全省中医药适宜技术网络 视频平台建设(县级平台)	城区红草中心卫生院	城区(汕 尾)	40.0	
省名中医传承工作室建设 (柯青工作室)	海丰县中医院	海丰县 (汕尾)	10.0	
中医院治未病中心(平台) 建设(治未病平台)	陆丰市中医院	陆丰市 (汕尾)	100.0	
中医院治未病中心(平台) 建设(治未病平台)	陆河县中医院	陆河县 (汕尾)	100.0	

## 附录 4

表 17-1 综合评价情况明细表

项目类别	项目总数	项目承担单位	初评综合得分	初评等级	现场评价等级	终评结果	类别最终得分
1) 省级中医院设备及修缮项目	3	广东省第二中医院	97.5	优	优	优	95
		广东省中医院	97	优	优	优	
		广州中医药大学第一附属医院	95.75	优	优	优	
2) 省市级中医院建设项目	3	湛江市第一中医院院	93.75	优	优	优	95
		潮州市中医院	90.75	优	优	优	
		广州中医药大学第三附属医院	88.5	优	优	优	
3) 中医药信息化规划能力及应用水平建设项目	4	广东省中医院	93	优	-	优	92.5
		广东省第二中医院	81.95	良	-	良	
		普宁市中医院	84	优	-	优	
		江门市五邑中医院恩平分院	94	优	优	优	
4) 中医院治未病中心(平台)建设项目	5	广东省中医院	100	优	优	优	86.61
		广东省中医院珠海医院	100	优	优	优	
		广东省第二中医院	98.25	优	优	优	
		广州中医药大学第一附属医院	97.35	优	优	优	
		广州中医药大学第三附属医院	95.35	优	优	优	
	26	广东省第二中医院黄埔医院	91.6	优	-	优	
		海珠区中医医院	98.25	优	优	优	
		龙岗区中医院	97.75	优	优	优	
		广州市正骨医院	97	优	优	优	
		梅州市中医院(田家炳医院)	97	优	优	优	
		东莞市虎门中医院	95.8	优	优	优	
		仁化县中医院	95.55	优	优	优	
		天河区中医医院	94.25	优	-	优	
		番禺区中医医院	94	优	-	优	
		霞山区骨伤科医院	93.5	优	-	优	
		端州区华佗医院	93	优	-	优	
		始兴县中医院	92.8	优	-	优	
南沙区中医医院	91.95	优	-	优			
连山壮族瑶族自治县中医院	91.75	优	-	优			

项目类别	项目总数	项目承担单位	初评综合得分	初评等级	现场评价等级	终评结果	类别最终得分
4) 中医院治未病中心(平台)建设项目		阳江市中西医结合医院	91.65	优	-	优	86.61
		白云区中医医院	86.35	良	-	良	
		饶平县中医院	83.5	良	-	良	
		江海区中西医结合医院	83.45	良	-	良	
		龙门县中医医院	82.5	良	-	良	
		广东省中西医结合医院(南海区中医院)	74.75	中	-	中	
		廉江市中医院	72	中	-	中	
		曲江区中医院	61.75	合格	合格	合格	
		清新区中医院	—	—	暂不参加评价	暂不参加评价	
		连南瑶族自治县中医院	—	—	暂不参加评价	暂不参加评价	
		陆丰市中医院	—	—	合格	合格	
		陆河县中医院	—	—	差	差	
5) 全省中医药适宜技术网络视频平台建设项目	3	广东省中医院	97.5	优	优	优	79.23
		广州中医药大学第一附属医院	94.4	优	-	优	
		广东省第二中医院	90.85	优	-	优	
	23	中山市中医院	94.55	优	优	优	
		湛江中医学校	94	优	-	优	
		潮安区庵埠华侨医院	92.8	优	-	优	
		武江区龙归镇中心卫生院	90	优	-	优	
		仁化县人民医院	87.4	良	-	良	
		东莞市中医院	86.6	良	-	良	
		曲江区马坝镇卫生院	85.8	良	-	良	
		坡头区人民医院	85.3	良	-	良	
		濠江区珠浦医院	84.8	良	-	良	
		清城区中医院	80.15	良	-	良	
		浈江区犁市镇中心卫生院	79.3	中	-	中	
		清新区人民医院	78.8	中	合格	合格	
		南澳县人民医院	76.55	中	-	中	
		连南瑶族自治县人民医院	74	中	合格	合格	
潮南区人民医院	71.9	中	-	中			
连山壮族瑶族自治县人	57.8	差	中	中			

项目类别	项目总数	项目承担单位	初评综合得分	初评等级	现场评价等级	终评结果	类别最终得分
		民医院					
		阳东区人民医院	50.25	差	差	差	
		江城区人民医院	48.75	差	差	差	
		榕城区梅云社区卫生服务中心	—	—	中	中	
		云城区腰古中心卫生院	—	—	差	差	
		龙湖人民医院	—	—	中	中	
		云安区人民医院	—	—	合格	合格	
		城区红草中心卫生院	—	—	中	中	
6) 全省中医类别医师资格实践技能考试片区基地建设项目	4	湛江中医学校	95.5	优	优	优	92.5
		江门市中医药高等职业学院	95	优	优	优	
		嘉应学院医学院	93.8	优	—	优	
		佛山市中医院	87.2	良	—	良	
7) 综合医院中医药工作示范单位项目	5	广州市第八人民医院	100	优	优	优	83
		深圳市妇幼保健院	89.175	良	—	良	
		中山市黄圃人民医院	80.9	良	—	良	
		阳江市人民医院	71	中	—	中	
		中山大学附属第一医院	—	—	中	中	
8) 中药特色技术传承人才培养项目	20	广州市中医医院	96.5	优	优	优	89.5
		肇庆市第二人民医院	94.5	优	—	优	
		新会区中医院	92.05	优	—	优	
		端州区华佗医院	92	优	—	优	
		天河区中医医院	91.5	优	—	优	
		深圳市中医院	91.5	优	—	优	
		高明区中医院	90.5	优	—	优	
		深圳市中医院	90.3	优	—	优	
		江门中医药学校	90.05	优	—	优	
		广州中医药大学	90.05	优	—	优	
		广州中医药大学第一附属医院	89.85	良	—	良	
		广东省中医院	89.5	良	—	良	
		广州中医药大学第三附属医院	88	良	—	良	
		广东省中医院	87.5	良	—	良	
		佛山市中医院	87	良	—	良	
		清远市中医院	86.85	良	—	良	
南方医科大学中西医结合医院	84.55	良	—	良			
广东省中西医结合医院	84.2	良	—	良			

项目类别	项目总数	项目承担单位	初评综合得分	初评等级	现场评价等级	终评结果	类别最终得分
		(南海区中医院)					
		广东省中西医结合医院 (南海区中医院)	82.95	良	-	良	
		广东药科大学	70	中	-	中	
9) 县区级中医临床技术骨干培训项目	6	广州中医药大学第一附属医院	97.8	优	优	优	90
		广东省中医院	95	优	优	优	
		南方医科大学中西医结合医院	94	优	-	优	
		广州中医药大学第三附属医院	89.5	良	-	良	
		广东省第二中医院	89.5	良	-	良	
		广东省中西医结合医院	85.5	良	-	良	
10) 国医大师学术思想传承项目	3	广州中医药大学第一附属医院	周岱翰	94.6	优	95	91.67
			邓铁涛	87.1	良	85	
		广东省中医院	禩国维	93	优	95	
11) 全国名中医传承工作室建设项目	4	广东省中医院	林毅	100	优	95	95
			刘茂才	94.5	优	95	
		广州中医药大学第一附属医院	欧阳惠卿	98.8	优	95	
		广东省第二中医院	邱健行	91.95	优	95	
12) 传染病中医药防治研究项目	2	广州市第八人民医院	92.55	优	优	优	90
		广东省中医院	88.75	良	-	良	
13) 第六批全国老中医药专家师承项目继承人经典理论培训项目	1	广州中医药大学继续教育学院	98.75	优	优	优	95
14) 全国基层名老中医药专家传承工作室继承人集中理论培训项目	1	广州中医药大学继续教育学院	98	优	优	优	95
15) 中医药管理机构人才及中医院管理人才培训项目	1	中山大学	99	优	优	优	99

项目类别	项目总数	项目承担单位		初评综合得分	初评等级	现场评价等级	终评结果	类别最终得分
16) 中医住院医师(全科医生)规范化培训师资培养项目	1	广东省中医院		99.5	优	优	优	95
17) 第三批省名中医师承项目	51	广州中医药大学	继续教育学院	95.4	优	优	优	83.85
			张忠德	97.8	优	优	优	
			吴万垠	93.9	优	-	优	
			艾宙	90.7	优	-	优	
			范瑞强	90.7	优	-	优	
			阮岩	89.5	良	-	良	
			林定坤	89.5	良	-	良	
		南方医科大学	贾钰华	93.25	优	-	优	
			李娟	90.95	优	-	优	
		梅州市第二中医医院	温乃元	92.15	优	-	优	
		广东省第二人民医院	刘浩	91.9	优	-	优	
		深圳市中医院	黄彬	91.35	优	-	优	
			高雪	89.65	良	-	良	
			周大桥	89.4	良	-	良	
			李浩	84	良	-	良	
			童光东	75.25	中	-	中	
		潮州市中医院	陈立生	90.5	优	-	优	
		广州市中西医结合医院	龙德	90.45	优	-	优	
		湛江市第二中医医院	郑泽荣	90	优	-	优	
			招仕富	83.1	良	-	良	
		广东省人民医院	黄松柏	89.45	良	-	良	
			叶安娜	88.45	良	-	良	
		佛山市第二人民医院	张卫华	89.25	良	-	良	
			李逸群	88.9	良	-	良	
		惠来县慈云中医院	胡水勋	89	良	中	中	
		黄埔区中医医院	郝建军	88.4	良	-	良	
		宝安区中医院(集团)	饶克瑯	87.65	良	-	良	
暨南大学	孙升云		87.3	良	-	良		



项目类别	项目总数	项目承担单位		初评综合得分	初评等级	现场评价等级	终评结果	类别最终得分
17) 第三批省名中医师承项目		惠州市中心人民医院	钟启腾	87.25	良	-	良	83.85
		汕头市中医院	郑瑞璋	85.9	良	-	良	
			杨燕贤	84.1	良	-	良	
		肇庆市中医院	吴社泉	85.45	良	良	良	
		中山市中医院	李燕林	85.25	良	-	良	
			赖海标	84.25	良	-	良	
		佛山市中医院	曾莺	84.25	良	-	良	
		广东医科大学	刘强	83.95	良	-	良	
		信宜市中医院	陈永炎	82.95	良	-	良	
		广东省第二中医院	高敏	82.95	良	-	良	
			陈宁	81.7	良	-	良	
			刘文刚	72.7	中	-	中	
		广东药科大学	洪敏	81	良	-	良	
			刘强	83.95	良	-	良	
		惠州市中医院	王丽	79.95	中	-	中	
		高州市中医院	李鳌才	79.25	中	-	中	
		清远市中医院	胡金明	77.95	中	-	中	
		广东省妇幼保健院	刘颖	-	-	中	中	
南山区人民医院	黄胜光	72.5	中	合格	合格			
兴宁市中医院	杨郎	65.45	合格	合格	合格			
清远市妇幼保健院	曾宪进	63.5	合格	合格	合格			
中山大学附属第一医院	陈泽雄	-	-	差	差			
中山大学附属第一医院	张诗军	-	-	差	差			
18) 省名中医传承工作室建设项目	80	清远市中医院	黄宗良	96	优	优	优	81.20
			胡金明	81	良	-	良	
		湛江市第二中医医院	肖波	94.05	优	-	优	
		广州中医药大学第一附属医院	李赛美	93.6	优	-	优	
			冼绍祥	90.45	优	-	优	
			何伟	89.7	良	-	良	
			赵立诚	88.75	良	-	良	
			林丽珠	87.5	良	-	良	
刘小虹	85.25		良	-	良			
庄礼兴	85.15	良	-	良				

项目类别	项目总数	项目承担单位		初评综合得分	初评等级	现场评价等级	终评结果	类别最终得分
18) 省名中医传承工作室建设项目		广州市荔湾区中医院	沈坚华	93.4	优	-	优	81.20
		广东药科大学附属第一医院	郭姣	89.9	良	-	良	
		广州市中医医院	黄德弘	89.75	良	-	良	
			祝维峰	76.55	中	-	中	
			徐雯	74.5	中	-	中	
		汕头市中医医院	陈超	89.2	良	-	良	
			林创坚	80.6	良	-	良	
		广州医科大学附属第一医院	邱志楠	88.75	良	-	良	
		肇庆市中医院	吴社泉	87.55	良	-	良	
			谢少龙	86.15	良	-	良	
		广东省中医院	黄燕	87.05	良	-	良	
			刘金文	87.05	良	-	良	
			黄培新	86.85	良	-	良	
			陈志强	86.75	良	-	良	
			李云英	82.7	良	-	良	
			池晓玲	81.45	良	-	良	
			陈达灿	79.25	中	-	中	
		梅州市第二中医医院	温乃元	86.5	良	-	良	
			曾胜	85.25	良	-	良	
		深圳市中医院	魏周科	86.25	良	-	良	
			杨卓欣	82.1	良	-	良	
			周大桥	81.9	良	-	良	
			彭力平	64.2	合格	合格	合格	
		阳江市中医医院	冯小燕	85.95	良	-	良	
			李爱民	82.65	良	-	良	
		广东省人民医院	王昌俊	85.9	良	-	良	
		南方医科大学中西医结合医院	谢炜	85.4	良	-	良	
			文小敏	84.85	良	-	良	
			魏连波	81.85	良	-	良	
			周迎春	81.2	良	-	良	
广州中医药大学顺德医院(顺德区中医院)	黄枫	85.15	良	-	良			
珠海市中西医结合医院	刘志龙	84.2	良	-	良			

项目类别	项目总数	项目承担单位		初评综合得分	初评等级	现场评价等级	终评结果	类别最终得分
18) 省名中医传承工作室建设项目		中山大学附属第三医院	杨宏志	83.5	良	-	良	81.20
		罗定市中医院	梁其源	83.1	良	-	良	
		广州中医药大学第三附属医院	黄宏兴	82.7	良	-	良	
			方坚	79.75	中	-	中	
			于天启	75.5	中	-	中	
		广东省中西医结合医院	李俊雄	82.35	良	-	良	
			廖志山	81.6	良	-	良	
		广州市正骨医院	黄崇博	82.25	良	-	良	
		中山市中医院	李旭	82.25	良	-	良	
			陈金泉	76	中	中	中	
		广东省第二中医院	范德辉	82.15	良	-	良	
			戈焰	79.65	中	-	中	
			汪何	69.9	合格	中	中	
			许学猛	66.25	合格	良	良	
			谢波	65.2	合格	中	中	
		东莞市中医院	蔡立民	82.1	良	-	良	
			叶小汉	76.85	中	-	中	
		暨南大学附属第一医院	陈利国	81.75	良	-	良	
		深圳市宝安中医院(集团)	金远林	81.65	良	-	良	
			尹建平	78.6	中	-	中	
		揭阳市中医院	卢永兵	81	良	良	良	
		广州市中西医结合医院	陈朝俊	80.95	良	-	良	
		广东省妇幼保健院	陈凤媚	80.15	良	-	良	
		佛山市中医院	蒋开平	79.5	中	-	中	
		江门市五邑中医院	余尚贞	76.9	中	-	中	
			杜发斌	75.2	中	-	中	
		湛江市第一中医医院	蔡柏	76.5	中	-	中	
		河源市中医院	钟强	74.45	中	中	中	
		惠州市中医院	陈洪	68.6	合格	合格	合格	
		韶关市中医院	黄献民	68.35	合格	中	中	
佛山市顺德区第一人民医院	龙倩玲	66.25	合格	合格	合格			
韶关市粤北人民医院	饶振芳	65.7	合格	良	良			

项目类别	项目总数	项目承担单位		初评综合得分	初评等级	现场评价等级	终评结果	类别最终得分
18) 省名中医传承工作室建设项目		广东省第二人民医院	梁兆球	64.9	合格	合格	合格	81.20
		茂名市中医院	黎治荣	64.1	合格	差	差	
		茂名市中医院	张帆	-	-	-	差	
		潮州市中医医院	林汉森	56	差	差	差	
		广东医科大学附属医院	莫通	-	-	-	中	
20) 中医药创新研究中心建设项目	5	广东药科大学	郭姣	90.5	优	中	中	85
			王秋红	87.1	良	-	良	
			杨全	83.7	良	-	良	
		广东省中医院		90	优	-	优	
		南方医科大学		89.6	良	-	良	
		广州中医药大学第一附属医院		89.5	良	-	良	
		广东省第二中医院		86.6	良	-	良	
24) 对外交流与合作项目	5	广州市卫生计生委(广州白云山和记黄埔中药有限公司神农草堂中医药博物馆)		100	优	优	优	89
		汕头市卫生计生局(广东太安堂药业股份有限公司)		93.5	优	-	优	
		江门市卫生计生局(江门市新会陈皮村市场股份有限公司)		91.5	优	-	优	
		惠州市卫生健康局		90	优	-	优	
		广东省中医药局(人之初杂志社)		-	-	合格	合格	
25) 省级中医药宣传平台项目	2	广州中医药大学第一附属医院		-	-	中	中	85
		广东省中医药局		-	优	-	优	
26) 中医药科普宣传项目	1	广东省中医药局		-	优	优	优	95
27) 中医药文化宣传教育基地建设项目	13	广州白云山中一药业有限公司		100	优	优	优	89.62
		湛江市卫生健康局		99	优	优	优	
		惠州市卫生健康局		97	优	优	优	
		广东太安堂药业股份有限公司		96.5	优	优	优	

项目类别	项目总数	项目承担单位	初评综合得分	初评等级	现场评价等级	终评结果	类别最终得分
		南寿峰健康产业园	96.5	优	优	优	
		阳春市中医院	95	优	优	优	
		无限极(中国)有限公司 新会生产基地	94	优	-	优	
		禅城区博物馆	88.5	良	-	良	
		龙岗区中医院	83	良	-	良	
		化州市中医院	82	良	-	良	
		珠海经济特区天然药物 研究所有限公司	82	良	-	良	
		肇庆市中医院	80.4	良	-	良	
		清远市卫生健康局	78.5	中	-	中	
28-1) 科教评审、 检查业务项目	7	佛山市中医院	98.8	优	优	优	93.57
		广东省中医院	97	优	优	优	
		广州中医药大学继续教育 学院	94.8	优	-	优	
		广州中医药大学第一附 属医院	93	优	-	优	
		广东省第二中医院	91.95	优	-	优	
		中山市中医院	90	优	-	优	
		广东省第二中医院	89.53	良	-	良	
28-2) 中医药统计与 信息化项目	1	广东省卫生健康委服务 中心	-	-	-	-	-
28-3) 传统医学 师承和确有专长 人员医医师资格 考核项目	1	广州中医药大学继续教育 学院	92.15	优	-	优	95
28-4) 广东省中 医医术确有专长 医师资格考核项 目	1	广州中医药大学继续教育 学院	92.95	优	-	优	95
28-5) 依法行政 等管理工作项目	1	广东省中医药局	100	优	-	优	95
29) 动态保护项 目	1	广州中医药大学	92.6	优	-	优	95
30) 人才培养项 目	1	广州中医药大学	79	中	-	中	75
31) 生产基地评 估项目	1	广东省中医药科技发展 交流中心	73.5	中	合格	合格	65

项目类别	项目总数	项目承担单位	初评综合得分	初评等级	现场评价等级	终评结果	类别最终得分
32) 文化保护项目	1	广东省中医药博物馆	85.2	良	-	良	85
33) 资源动态监测项目	1	广州中医药大学	71	中	中	中	75
合计			85.72	-	-	良	-

表 17-2 最终绩效评价结果的计算方法说明表

序号	评价等级	项目数	占比	等级分数	累计分数
1	优	105	36.2%	95	9975
2	良	116	40%	85	9860
3	中	42	14.4%	75	3150
4	合格	15	5.1%	65	975
5	差	9	3.1%	55	495
6	暂不评价	3	1%	-	-
合计		290	100%	-	24455

## 附录 5

表 18-1 省属单位使用年限一年期项目资金实际支出率明细表

排名	项目单位	项目名称	到位金额 (万元)	支出金额 (万元)	支出率 (%)
1	广东省中医院	传染病中医药防治研究	20	20	100
		国医大师学术思想传承	25	25	100
		全省中医药适宜技术网络视频 平台建设	50	50	100
		省级中医医院设备及修缮项目	2926	2926	100
		省名中医传承工作室建设	70	70	100
		省名中医工作津贴	9	9	100
		省名中医工作津贴 (广东省中医院珠海医院)	2	2	100
		县区级中医临床技术骨干培训	10	10	100
		中医药创新研究中心建设	200	200	100
		中医药特色技术传承人才培养	6	6	100
		中医药信息化规划能力及应用 水平建设	17	17	100
		中医药专项建设工作 (科教评审、检查业务)	2	2	100
		中医住院医师(全科医生)规 范化培训师资培养	60	60	100
1	广东医学院附属 医院	省名中医工作津贴	2	2	100
		省名中医传承工作室建设	0	0	0
1	中山大学附属第 一医院	省名中医工作津贴	2	2	100
		综合医院中医药工作示范单位	50	2	4
1	汕头大学医学院 第二附属医院	省名中医工作津贴	1	1	100

排名	项目单位	项目名称	到位金额 (万元)	支出金额 (万元)	支出率 (%)
5	广州中医药大学 第一附属医院	省级中医医院设备及修缮项目	2850	2850	100
		省名中医工作津贴	8	8	100
		中医药创新研究中心建设	200	200	100
		中医药专项建设工作 (科教评审、检查业务)	2	2	100
		县区级中医临床技术骨干培训	10	9.76	97.6
		省名中医传承工作室建设	70	60.6	86.58
		中医药特色技术传承人才培养	3	1.7	56.67
		国医大师学术思想传承	50	25.83	51.67
		全省中医药适宜技术网络视频 平台建设	50	24.7	49.4
		省级中医药宣传平台 (中国中医药记者站)	20	1	5
6	暨南大学附属第 一医院	省名中医工作津贴	1	1	100
		省名中医传承工作室建设	10	9.55	95.53
7	嘉应学院	全省中医类别医师资格实践技 能考试片区基地建设	100	93.28	93.28
8	广州中医药大学 附属骨伤科医院	省名中医工作津贴	2	2	100
		县区级中医临床技术骨干培训	10	10	100
		中医药特色技术传承人才培养	3	3	100
		省名中医传承工作室建设	30	25.54	85.12
9	广东省中医药局	对外交流与合作	20	20	100
		省级中医药宣传平台	150	150	100
		中医药科普宣传	250	243	97.20
		中医药专项建设工作	548	412	75.18
10	广东省妇幼保健院	省名中医传承工作室建设	10	8.18	81.85



排名	项目单位	项目名称	到位金额 (万元)	支出金额 (万元)	支出率 (%)
11	广东省第二中医院	县区级中医临床技术骨干培训	10	10	100
		省名中医工作津贴	3	3	100
		省级中医医院设备及修缮项目	855	855	100
		中医药专项建设工作 (科教评审、检查业务)	52	33.8	65
		全省中医药适宜技术网络视频 平台建设	50	28.61	57.22
		中医药创新研究中心建设	200	105.36	52.68
		省名中医传承工作室建设	50	23.74	47.48
		中医药信息化规划能力及应用 水平建设	60	9.55	15.92
		广东省中医药建设项目专项资金 监控与绩效评价系统	60	9.55	15.92
		岭南中药材保护 (生产基地评估)	80	资金冻结	0
12	南方医科大学中 西医结合医院	县区级中医临床技术骨干培训	10	10	100
		中医药特色技术传承人才培养	3	2.38	79.33
		省名中医传承工作室建设	40	22.15	55.38
13	南方医科大学	省名中医工作津贴	3	3	100
		中医药创新研究中心建设	100	57.09	57.09
14	广东药学院附属 第一医院	省名中医工作津贴	1	1	100
		省名中医传承工作室建设	10	3.31	33.08
15	广东省人民医院	省名中医工作津贴	1	1	100
		省名中医传承工作室建设	10	2.82	28.16
16	广州中医药大学	第六批全国老中医药专家师承 项目继承人经典理论培训	17	17	100

排名	项目单位	项目名称	到位金额 (万元)	支出金额 (万元)	支出率 (%)
16	广州中医药大学	全国基层名老中医药专家传承工作室继承人集中理论培训项目	18	18	100
		省名中医工作津贴	1	1	100
		中医药特色技术传承人才培养	3	2.98	99.31
		中医药专项建设工作 (科教评审、检查业务)	10	9.34	93.41
		岭南中药材保护 (动态保护)	50	35.2286	70.46
		中医药专项建设工作 (传统医学师承和确有专长人员医师资格考核)	30	10.93	36.45
		岭南中药材保护 (资源动态监测)	120	42.5168	35.43
		岭南中药材保护 (人才培养)	50	6.2005	12.4
		岭南中药材保护 (文化保护)	200	10.7805	5.39
		中医药专项建设工作 (全省中医医术确有专长医师资格考核考试项目)	160	1.63	1.02
17	广东药科大学	中医药创新研究中心建设	100	23.72	23.72
		中医药特色技术传承人才培养	3	0.5	16.67
18	中山大学	中医药管理机构人才及中医院管理人才培养	30	30	100
19	广东省第二人民医院	省名中医传承工作室建设	10	2	20

排名	项目单位	项目名称	到位金额 (万元)	支出金额 (万元)	支出率 (%)
20	中山大学附属第三医院	省名中医传承工作室建设	10	2	20
21	广东省卫生厅政务服务中心	中医药专项建设工作	40	40	100

表 18-2 省属单位使用年限二年期项目资金实际支出率明细表

(注: 支出金额为 0 的项目, 是项目单位未按时进行网上填报, 故专家未评审)

排名	项目单位	项目名称	到位金额 (万元)	支出金额 (万元)	支出率 (%)
1	广东省中医院	全国名中医传承工作室建设	100	100	100
		中医院治未病中心(平台)建设	100	100	100
		中医院治未病中心(平台)建设 (珠海分院)	100	100	100
1	华南农业大学	面上科研项目	2	2	100
3	祈福医院	面上科研项目	1	1	80
4	广州中医药大学第一附属医院	全国名中医传承工作室建设	50	41.19	82.38
		中医院治未病中心(平台)建设	100	69.8098	69.81
5	广东岭南职业技术学院	面上科研项目(局转拨)	2	1.34	67
6	广东省第二中医院	中医院治未病中心(平台)建设	100	100	100
		单方验方科研项目	15	4.3	28.67
		面上科研项目	22	4.52	20.55
		重点科研项目	32	2.92	9.13
		全国名中医传承工作室建设	50	4.3	8.6
		第三批省名中医师承	18	1.35	7.5
7	暨南大学	面上科研项目	8	4.23	52.83

排名	项目单位	项目名称	到位金额 (万元)	支出金额 (万元)	支出率 (%)
		第三批省名中医师承	6	2.42	40.32
8	中山大学	重点科研项目	10	7.15	71.5
		面上科研项目	12.46	2.66	21.32
		第三批省名中医师承	12	3	25
9	广州中医药大学附属骨伤科医院	中医院治未病中心(平台)建设	100	32.78	32.78
10	广州中医药大学	单方验方科研项目	90	19.13	21.25
		重点科研项目	98	19.12	19.51
		面上科研项目	72	7.38	10.25
		第三批省名中医师承	36	6.88	19.12
11	广东省第二人民医院	第三批省名中医师承	6	1.19	19.85
		面上科研项目	6	0.9	15
12	广东药科大学	面上科研项目	3	1.22	40.68
		第三批省名中医师承	6	2	33.33
13	南方医科大学	面上科研项目	16	4.15	25.93
		单方验方科研项目	15	0.92	6.15
		第三批省名中医师承	12	0.63	5.27
		重点科研项目	12	0	0
14	广东省人民医院	第三批省名中医师承	12	0.77	6.43
		面上科研项目	9	0.55	6.17
		重点科研项目	10	0.5	5
15	汕头大学医学院	面上科研项目	2	0.1	5
16	广东医科大学	第三批省名中医师承	6	0.32	5.39
		面上科研项目	5	0.15	3
17	广东省妇幼保健院	第三批省名中医师承	6	0	0
		重点科研项目	12	0	0

排名	项目单位	项目名称	到位金额 (万元)	支出金额 (万元)	支出率 (%)
		面上科研项目	1	0	0
18	广东省医学实验动物中心	面上科研项目	1	0	0
19	嘉应学院医学院	面上科研项目	1	0	0
20	广东食品药品职业学院	面上科研项目	8	0	0

表 18-3 省属单位使用年限三年期项目资金实际支出率明细表

排名	项目单位	项目名称	到位金额 (万元)	支出金额 (万元)	支出率 (%)
1	广州中医药大学附属骨伤科医院	省市级中医院建设	1000	1000	100
2	广州中医药大学	第三批省名中医师承	30	3.1071	10.36
